

274

Nr. ~~41~~ de ordine din mapă.

5.06

Vol IV B

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. 23

FASCICULA Nr. 41

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Bris. „Adormirea Maicii Domnului”

si Sf. Filoftea - Belciugatele

Jud. Ilfov

- Căminul Belciugatele de Jos - Iris. Adormirea M. S.
- Căminul Cojerti - Iris. Adormirea M. S.

274

322

CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ÎSTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul

Ilfov

Comuna

Belciugatele

Cătunul

Belciugatele de jos

1) Felul monumentului.

Biserica

Numele și hramul. Adorm. M. Domnulea

Mănăstire

Schit

Biserică parohială

Da

Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sânnuri?

De zid cu sânnuri

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Anul de fondare 1913-1915

D. D. r. Dinu Bratianu, Elie Alexandrescu și D. l. Hagiu

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Inscripție de fondare este săpată în piatră și zugrăvită

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu are clădiri nu mai cașale locuitorilor

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor ne înflorat

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Are una de marmură radicata în anul 1892 cu inscripția V. Petrescu și peste o sută cruci mici de piatră cu inscripțiile ne deosebitabile

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Nu, este zugrăvită pe dinașara.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De lemn

vechimea 1915 este frumoasă împodobită

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

28 strane sfeșnice 2 mari de lemn și 10 mici i.d.

2 sfeșnice mari sunt sculptate cu inscripția M. Radulescu.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au și numele sfinților ce reprezintă.

Nare nici un inventari și nici icoane

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, paștelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Nare inventari dar să găsești un policandru vechi și 3 candelote fără inscripție.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nare să găsești 4 mănichiuri vechi un stihari și un corolan și un felon.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nare nici un document sau inventari.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Nuare inventar dar cărți vechi
să găsească 12 menci
1 sfânta Evangheli
1 Apostol 1 cazanie
și 1, ciorosilor mic

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Un clopot mic
cu inscripția V. Cereșez

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Acest Sfânt locaș sau
facut din nou precum
cau aratat mai sus.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nimica

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nimica monimente
Numai casă țărănească veche

REBATUL ROMANIEI



Semnătura Parohului (Superiorului)

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

PAROCHIA BISERICII
BELCIUGATU
JUD. IALFOV

No.

Parohul Bisericii
Cobuztanu

REPUBLICA ROMÂNIA

PARCUL MONUMENTELOR
COM. BELCIUBATU
JUD. ULFOV

No. 8

cm 7

8 Februarie 1922

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia col. 1
nr. 244 f. 2

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
No 06122 * 11.FEV.1922 *
REGISTRATURA GENERALA

Scrisoare Minister

La respectiva adresa: S. V. Voastre
735 am. avarie a inavuta
avizatele d. v. chestionare
privitoare la monumentele
istorice din aceasta Comuna.

Preot Paroh. Iero: Varlaam Bobuscanu


Domnului S. V.

Domnului Minister al Cultelor si

Instructionii

Ad. t. a. Casei Biserice

Chestionar
privitor
La monumentele istorice.



Județul Ilfov
Comuna Beleugatele Cojoc
Căminul (Cojoc)

1. Titlul monumentului Biserica filială } Adormirea Măriei
Biserici filiale Filială }

2. E de zid sau de lemn E drept- E de zid intrucumhură
unghiulară sau cu sănuri

3. Care e anul de fondare și nu- După V. Noșcu 1724.
mele ctitorilor E anul de fondare în 1522 greșit
Ctitor este T. D. Cretulescu

4. E înscrisă de fondare, În Anul 1724
și celebrante și celebrante
nu sa pot ceta

5. Ce clădiri sau ziduri sunt. Un han vechi de 20 ani și curtea
boierască

6. Are biserica pridvor cu stâlpi. Nare.

7. Are pietre de morminte vechi Are una de 80 ani cu inscripția
D.tru Coman.

8. Zugrăviile sunt vechi sau noi Zugrăviile sunt noi și pedinașară
nu este zugrăvită

9. Templu e de zid sau de lemn. E de zid din anul 1522
ce vechime are E frumos, înpo- și frumos în podolita.
dobit

10. Câte strane vechi și sfesnice & 14, strane 2, sfesnice mari
de lemn sculptate sunt și 8, mici
11. Inventarul icoanelor vechi, Nare
12. Inventarul candelilor cadelnitălor Nare.
13. Inventarul rezmitelor vechi Nare
14. Ce pomelnice vechi Nare
15. Inventarul cartilor de Nare dar carti să găsească 12. Mineu
slujbă 1 Sf. Evanghelie 1, Apostol 1, crasosloamă
1 cazanie
16. Ce clopote vechi sunt. Nare fiind luat de Nemți
17. Când sau făcut ultima repara- În anul 1911, de D-l I.D.
rație a bisericii Cretulescu
18. Ce legende istorice sa poartese. Nimica
19. Ce lucruri istorice sunt prin: O casă boierească și mai multe
prejur casă țărănești



Pro. V. Vorlaam Coburstanu

București, 7 Iunie 1943.-



25. 11. 1913.

[illegible]

22 VII 1943
Le com. Brodskai
V. Bratuly
Comunicat rep.
concept
signat.

21.7.943 *Satracutia*
Procne Verbe
Salmat
Spue Gordon

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
JG 032434 DIN 25 JUN. 1943
REGISTRATURA GENERALA

Subsemații, Elena și Ing.Gheorghe Crețu și Florica
și Gheorghe Fundănescu, proprietarii moșiei Cojești com.Bel-
ciugatele Juğ.Ilfov avem onoare a vă aduce la cunoștință ur-
mătoarele:

Biserica din satul Cojești com. Belciugatele jud. Ilfov, în urma cutremurului suferind deteriorări grave nu mai corespunde unei normale funcționări.-

Subsemnații împreună cu locuitorii satului Cojești, luând inițiativa pentru repararea Bisericii am stabilit ca sătenii satului Cojești să pună la dispoziție pentru acest scop suma de circa lei 100.000.- una sută mii.

Întru'cât reparațiile ce vor necesita acestei biserici întrec cu mult suma de mai sus subsemnatii ne obligăm a contribui cu diferența de bani până la completarea sumei necesare reparației.-

Dorind ca reparațiile să înceapă de îndată, vă rugăm, Domnule Ministru, a dispune să se delege un Domn Arhitect pentru facerea devizului și conducerea lucrării.-

Primiți, vă rugăm, Doamnele Ministru, asigurarea
deosebitei noastre considerațiuni.-

26 v 943.
fl. Moirerum

pentru a lua în considerare
cu d. ing. directia pentru
a merge la bozandă în

V. J. J. J.

3 Julie 1843

Bag o' mine o' the
oleoptra.

Boony.

7 VII 1843

Julia

V 80
1000

1974

about 18

Handwritten text on a piece of aged, yellowed paper, possibly a label or note, with some illegible markings.



Robert H. Robinson
164 2502
MINIST. CULT. NATI.

17-011943
La Subcomisión Técnica
V. G. G. G.

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL. CULTELOR
Nr. 1463 + 26 JUN 1943 +
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția nr. 274

DOMNULUI MINISTRU AL CULTURII NATIONALE

Referat 16 Iulie 1943.

Am cercetat la foto lacului Bivnicei A. no Maici
Domnului din satul Capesti - Belciugatele Jud. Hargh.
Monumentul Totur de multa importanta, construit
de boeri Vacaresti la anul 1724. La 1911 Bivnicei
si urma lucrarilor de reparatii a suferit oara cari
mutilari, astfel s-au scos coasele de piatra la
si ferestre, s-a dat cu vopsea de albi peste
colosulele de piatra din interior, s-au astupat
doua ferestre originale si s-a facut o pictura in elei
fara importanta, este vechi fresca -

Am gasit toate vechile coase de piatra de la
ferestre cegate ca bordura de trotuar in
foto Bivnicei. Am pus imediat lucrarile
care le-au scos si depozitat in prichinul
Bivnicei, pentru a fi repuse la lacul lor ora cu
am erolat in deviz pentru a reduce Monumentul
la vechi lui infatisare.

Lucrarea se executa cu fondurile date de catre
Domnii Gh. Fundășeni si Trupiner. Trebuie
cau in privi sau sunt obligatia a raporta
cheltuielile si sub supravegherea serviciului
Technic al Comisariatului Monumentelor Totur
pentru a nu se stie si pentru a reduce
se cat posibil la vechi lui forma. -

Statuat am onorata a va insiinta planurile
relevu si un deviz de Valoare de lei 291.000,
negandho-va sa vine voiti a dispune. -

V. Moise

ROMANIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colectia CH

244 f. 6

Telefon: 439.00

Parohiei Bisericii

Adormirea M. Domnului

Comuna *Belciugatele*

Județul *Ielfor*

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Legea d-lui Ing. Cretu
h. G. Fundăneanu,

La Nr. *1463* / 94, avem onoare a vă trimite planul și

devizul în valoare de lei *291.000* aprobat de Comisiunea

Monumentelor Istorice, pentru lucrările de restaurare necesare

bisericii cu hramul *Adormirea M. Domnului din Sf. Filofteia*
satul Cozesti, rugându-vă să binevoiți a veghea ca ace-

ste lucrări să se execute întocmai, anunțând Comisiunea de înce-

perea lor și cerând lămuriri suplimentare la nevoie.

Angajarea, executarea și plata se vor face cu paza tuturor dis-

pozițiunilor legale în vigoare, cuprinse în legea contabilității

publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 167 din 31 Iulie

1929, în modificările din Monitorul Oficial Nr. 174 din 24 Iulie

1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice,

publicate de Monitorul Oficial Nr. 127/VI/931.

Nu se aprobă nici-o modificare a lucrărilor prevăzute în

deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.

p. MINISTRU,

(ss)
Prof. I. Popa

p. DIRECTOR,

(ss) V. Brătulescu

23-71-943

Sla bi uni, un
naș de pământ
pe pământ la
al III-le

Comandant
1463

original planuri
(partea) de tehnic
cu condiții ași


10 Aug. 1944
h. Cretu

C. 16.133. - M. O., Imprimeria Națională. - Md. 17

Format A 4
(210x297)

6 Sept. 1943 ^{Nota}

Al doilea rând de planuri
n' am o copie după pt
dizig. S'au dat astăzi
d. lui V. Mirescu pentru
a fi înmănat d-lui
Ing. Cretu u. G. Furdus



Biserica „Adormirea Maicii Domnului” si Sf. Filofteia.
Satul Căpăsti, Comuna Belciugatele Jud. Ilfov. —

ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU

lucrările de restaurare stăcăciunilor cauzate de cutremur si
lucrări de învelire —



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<u>Lucrări urgente de cutremur. —</u>					
	1) La boltile si arcurile dublouri interioare se vor curăța crăpăturile spăla, cu apă multă, împănă cu fire de fier si turna în ele geamă de ciment, cu puțină var gras. Luându-se mai înainte măsurile de a se astupa crăpăturile prin interiorul bisericii astfel ca geamă de ciment să nu curegă pe ferăști sau în biserică. — Turnutul zemei de ciment se va face prin podul bisericii turnându-se peptat până la umplerea completă a spațiului crăpăturii. Facutit la m. l. lucru complet executat, cuprins refăcutul în interior al tencușelor, în alptul crăpăturilor cu mortar de var gras si 25% ciment, complet din nou si măsurat înainte de executarea lucrării. —					
	La altar. 2 x 5.00 = m. l. 10. —					
	Noas. 2 x 3.00 = m. l. 6. —					
	" 2 x 2.50 = m. l. 5. —					
	Pronaos. 1 x 4.00 = m. l. 4. —					
	" 2 x 1.50 = m. l. 3. —					
	" 2 x 1.00 = m. l. 2. —					
	Pridor. 1 x 5.00 + 1.00 = m. l. 6. —					
	De reportat. ^{m. l.} 36. —					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .	36-				
	Asemenea la crăpăturile tîmplor (Tearstones) crăpăturile se vor desface cu sevă și o lățime de 2-3 cm. șola cu apă, impune cu fier de fier și turna în crăpături treptat zeamă de ciment ca mai sus; cuprins refăcutul tencușelor în cheptul crăpăturilor cu mortar de ciment gros și 25% ciment bine brisuit. - $3 \times 2,00 = m.l.$ 6					
	m.l.			42-500-		21000
2)	La ferți exteriori și interiori unde sunt crăpături și unde nu necesită tencușă de cărămidă, asemenea se vor desface crăpăturile cu sevă și o șola cu apă multă și turna în ele sub presiune zeamă de ciment ca mai sus. cuprins refăcutul tencușelor în cheptul crăpăturilor ca la (art 1) Se este la m.l. și măsurat înainte de executarea lucrărilor și după ce s-a întors și au cerstat toate crăpăturile la ferți unde multe pot să fie numai tencușala crăpătură nu bi zidărie - La ferți bin. $5 \times 4,00 = m.l.$ 20 - " Pridnor. " $3 \times 2,00 = m.l.$ 6					
	m.l.			26 400		10400
3	La casa scării unde crăpătură este mai serioasă și cu oclăchete mai mare se va face tencușă de zidărie pe o lățime de 0,60 și 0,30 odâncime, cu cărămidă presată bine arse lucată cu mortar de ciment, respectându-se în totul arhitectura bineicii, cuprins tencușă în zidărie veche. Treptat cu avansarea tencușă de zidărie crăpăturile se vor șola cu apă și turna în ele zeamă de ciment ca la art (1 și 2) m.l.			5-2300		11500
	De reportat . . .					

Când
lucra
face
comu
si un
pro
bis.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report .					217670
	Lucrări de construire Lei 48900					
	Lucrări de întreținere Lei 217670					
	Lei 266570					
	Livrare neprevăzută a m. v. și flotei la execuție și la aprobarea Comis. Marc. Totale. . . Lei 24430					
	Total Lei 291000					
	Adică domnia sa este nouăzeci și unu de mii lei. -					
	Lucrările se va executa respectându-se în total arhitectura monumentului, fără a aduce vreo schimbare sau adăugire de clădiri noi. Pentru orice lucrări în plus se va cere o nouă aprobare a Comis. Marc. Totale. Asemenea în cazul lucrărilor pentru orice lucrări se va cere proiectul Tehnic al C. M. Totale trimiterea delegatului - care va da toate înțelesurile necesare, monumentul fiind de multă importanță. -					
	Pentru curățirea picturii se va cere original Comis. Marc. Totale care va trimite la foto lucrări un pictor specialist. -					
	Intențit de -					
	V. Moșesov					
	Iulie 16. / 1943					
	De reportat .					



se minime
ce se
in bonde
in ianuarie
si adunarea
filme
stii.

16.7.43
S. Moșesov

BISERICA "ADORMIREA MAICEI DOMNULUI SI SF.FILOFTEIA

SATUL COJESTI, COMUNA BELCIUGATELE JUD. ILFOV.-

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ


PENTRU

lucrările de restaurarea stricăciunelor cauzate de cutremur și lucrări de întreț

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxi- liare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1)	<u>Lucrări urgente de cutremur</u> La bolțile și arcurile dublouri interioare se vor curăța crăpăturile, spăla cu apă multă, împănă cu pene de fier și turna în ele zeamă de ciment, cu puțin var gras, luându-se mai înainte măsurile de a se astupa crăpăturile prin interiorul bisericii astfel ca zeama de ciment să nu curgă pe pereți sau în biserică. Turnatul zemei de ciment se va face prin podul bisericii, turnându-se treptat până la umplerea completă a spațiului crăpăturii. Socotit la m.l. lucru complet executat, cuprins refăcutul în interior al tencuelilor în dreptul crăpăturilor cu mortar de var gras și 25% ciment, complet drisuite și măsurat înainte de executarea lucrării.- La Altar 2 X 5,00 = m.l. 10 " Naos 2 X 3,00 = m.l. 6 " " 2 X 2,50 = m.l. 5 Pronaos 1 X 4,00 = m.l. 4 " " 2 X 1,50 = m.l. 3 " " 2 X 1,00 = m.l. 2 Pridvor 1 X 5,00 + 1,00 = 6 m.l. 36 Asemenea la crăpăturile tâmplii (Iconostas), crăpăturile se vor desface cu scoaba pe o lățime de 2-3 cm., spăla cu apă, împănă cu pene de fier și turna în crăpături treptat zeamă de ciment ca mai sus; cuprins refăcutul tencuelilor în dreptul crăpăturilor cu mortar de var gras și 25% ciment bine drisuite.- 3 X 2,00 = m.l. 6 m.l. 6					
2)	La pereții exteriori și interiori unde sunt crăpături și unde nu necesită țesătură de cărămidă, asemenea se vor desface crăpăturile cu scoaba, spăla cu apă multă și turna în ele sub presiune zeamă de ciment ca mai sus, cuprins refăcutul tencuelilor în dreptul crăpăturilor ca la (art.1) Socotit la m.l. și măsurat înainte de executarea lucrărilor și după ce mai întâiu s'au cercetat toate crăpăturile la pereți unde multe pot să fie numai tencueala crăpată nu și zidăria.- La pereți bis. 5 X 4,00 = m.l. 20 " Pridvor 3 X 2,00 = m.l. 6 m.l. 26				500	21.000
3)	La casa scării unde crăpătura este mai serioasă și cu deschidere mai mare se va face țesătura de zidărie pe o lățime de 0,60 și 0,30 adâncime, din cărămidă presată bine arsă lucrată cu mortar de				400	10.400
	De reportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxi- liare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	ciment, respectându-se în totul arhitectura biseri- cei, cuprins tocatul în zidăria veche. Treptat cu avansarea țesăturii de zidărie, crăpătu- rile se vor spăla cu apă și turna în ele zeamă de ciment ca la art. (1 și 2)	m.l.	5	2.300		11.500
4)	La zidul despărțitor între Naos-Pronaos, la arcade unde cheile sunt căzute și dislocate se vor reface zi- dăria la loc cum a fost din cărămidă presată bine arsă lucrată cu mortar de ciment, cuprins împănatul cu pene de fier și refăcutul tencuelilor cu mortar de var gras bine drisuit.- 3 X 0,60 X 0,60 X 0,50 = m.c. 2	m.c.	54	0,50	10.000	6.000 48.900
5)	<u>Lucrări de întreținere ce trebuiesc executate</u> Desfăcutul zidăriei la ferestrele mari și rea- șezatul la loc a vechilor cadre de piatră găsite, refăcându-se la loc așa cum au fost și după cum se vede la cele două ferestre astupate cu zidăria.- Desfăcutul zidăriei 6x0,14 x0,14x1,20=m.c.0,126x Reșezatul cadrelor de piatră și fixatul lor cu mortar de ciment și pene de fier buc. 4 x 1000 4000 Complectări de zidărie nouă.- circa m.c. 0,500 x 8000 = 4000 Tencueli noi cu mortar de var gras circa m.p. 3 x 500 = 1500	lei 800 = 100 buc. 4 x 1000 4000 m.c. 0,500 x 8000 = 4000 m.p. 3 x 500 = 1500				100 4.000 4.000 1.500 9.500
6)	Tâmplărie din nou dublă din lemn de brad cu toc stejar, prevăzută cu toată fierăria necesară, grun- dăritul și datul de două ori în culoare de ulei în tonul stejarului. Tocul de lemn de stejar nu se va da în culoare de ulei ci numai cu ulei de înfierț simplu fără culoare. Maestru tâmplar care va executa lucrarea va lua la fața locului dimensiunile pentru fiecare fereastră în parte. Socotit la m.p. totul așezat la loc.- 6 X 0,60 X 1,60 = m.p. 5,76	m.p.	5,76	6	10.500	63.000
7)	Giamuri semi-duble simple necolorate sau cu desene complet așezate la loc cu chitul necesar.-	m.p.	12		400	4.800
8)	Curățitul coloanelor de piatră din interior de cu- loare de ulei care a fost dată în trecut și care sempă acoperă frumusețea lor, cu o soluție de acid clorhidric sau cu o soluție de sodă caustică și cu o perie de păr sau de pai (mătură) sub niciun motiv cu peria de sârmă care ar zgâria piatra. Se va spăla cu apă multă luându-se toate măsurile de a se evita accidentele. Asemenea se va curăța ca mai sus cadrul de piatră al ușii. Socotit în limita sumei de lei Lucrător 3 zile X lei 1.000 = lei 3.000 Material, feri, apă etc. " 5.000 " 8.000 Taxe cheltueli, beneficiu 30% lei 240 8.240					8.300
9)	Desfăcutul celor trei rozete de piatră din părțile laterale și la Altar cari au fost acoperite cu tencueală și curățitul lor complet de orice urmă de var, cu peria de pai și apă. Ele vor rămâne apa- rente și cu piatra naturală fără să fie date cu var sau vopsele în culori. Asemenea datul jos a De raportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxi- liare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report					
	tencuelilor burdușite dela corpul bisericei dela nivelul soclului până sub tocul ferestrelor, curățitul resturilor între cărămizi cu socaba de fier pe adâncimea de 2 cm. In preț se cuprinde și căratul molozului afară din șantier cu căruțele 3 X 0,60 X 0,60 = m.p.					
	12,00 + 0,30 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 0,30 + 10,00 + 1,60 + 1,50 + 1,70) x 0,60	m.p.	1,08			
		m.p.	21,84			
		m.p.	31,92	32	350	11.200
0)	Refăcutul la loc al tuturor tencuelilor arătate la corpul bisericei (afară de cele cari am arătat că nu se vor mai face la rozete) precum și în toate părțile unde unde se vor mai cere, din mortar de var gras și nisip aspru, fără niciun amestec de ciment care ar aduce umezirea (igrasia pereților). Totul complet executat cu respectul arhitecturii bisericei, trasul profilelor, drisculul etc.-	m.p.	32		600	19.200
1)	La corpul bisericei se vor răzui toate spoelile vechi cojite, se vor speclui fisurile tencuelilor căutând a nu se strica nimic din profilele arhitecturii la cornișe și la soclu. - Măsurat desfășurat 6,55 + 15,00 + 0,30 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 0,30 + 10,00 + 1,60 + 1,60 + 1,60 + 3,00) x 6,00 =	m.p.	353,70	354	15	5.310
2)	Spoeli la fațade cu lapte de var și grăsime animală (seu nu ulei vegetal) dată de două ori până la completă acoperire și în culoarea paiului. Nu se va da peste cadrele de piatră dela ferestre sau peste rozetele de sus, ele vor fi acoperite cu pânză de sac și în cazul că vor fi stropite cu var, vor fi imediat curățate cu peria de pai. Cadrele de piatră rămân aparente, piatră naturală. Socotit la m.p. măsurat desfășurat golurile archedelor dela pridvor se vor scădea.	m.p.	334		50	17.700
)	Trotuar în jurul bisericei din lespezi de beton de ciment de 0,80/0,80 și 0,15 grosime și cu o ușoară armătură de fier, așezate pe un strat de nisip de 15 cm. grosime. Lespezile vor fi încastrate 3 cm. sub tencueala soclului și cu panta necesară de scurgerea apelor. Trotuarul nu se va sclivisi, va rămâne aparent cu aspectul de piatră conglomerată. In preț se cuprinde săpatul și nivelatul terenului și rostuitul cu zeamă de ciment, care nu va fi trece peste marginea pietrei și nici nu se va fugui. Socotit la m.p. lucru complet executat -					
	59,00 X 0,80 = m.p.	47			1000	47.000
)	Ușă din nou la intrarea în biserică din lemn de stejar lucrată după un proiect ce va fi supus spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice, complet așezată la loc cu toată fierăria necesară și datul de două ori cu ulei fiert fără culoare, cuprins tocul de lemn de stejar 1,10 X 2,20 = m.p.	2,42			13000	31.560
	Lucrări de cutramur lei					48.900
	Lucrări de întreținere lei					217.670
						266.570
	De reportat					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxi- liare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					266.570
	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare și cu aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice.					24.430
				Total lei		291.000
	Adică două sute nouăzeci și una de mii tocmăi.-					
	Lucrarea se va executa respectându-se în totul arhitectura Monumentului, fără aduce vreă schimbare sau adăogire de clădiri noi. Pentru orice lucrare în plu se va cere o nouă aprobare a Comisiunii Monumentelor Istorice. Asemenea în cur lucrărilor pentru orice lămurire se va cere serviciului tehnic al Comisiunii l numentelor Istorice trimiterea delegatului său care va da toate îndrumările cesare, Monumentul fiind de multă importanță.- Pentru curățirea picturii se va cere avizul Comisiunii Monumentelor Istorice, care va trimite la fața locului un pictor specialist.- Când se va începe lucrarea se va face un sondaj comunicându-se Comisiunii adâ cimea și profilul fundațiilor bisericii.-					
					Intocmit de ss/ V. Moisesco Iulie 16/1943	
	Văzut 16. 7. 943 Arhitect, ss/Horia Teodoru					
				Conform cu originalul,		Ecat. Contic
	Total . . .					

Adică

Făcut de subsemnatul, în 19

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

P R E T U L

Auxiliare Parțiale TOTALE

Unitar TOTAL

Report . . .

zidul despărțitor între Noas-Pravass;
arcode, unde cele sunt cingute și
dislocuete, se vor refăce zidărie la loc
un o fost din cărămizi presă bine
cu lucrata cu mortar de ciment, cuprins
în pământul cu feră de fier și refăcutul
tencușelor cu mortar de var gros bine
lipscit. - $3 \times \frac{0.60 \times 0.60 \times 0.50}{2} = m.c. 4.54$

0.60 - 10.000 6000

Lei 48900-

Lucrări de întreținere ce trebuiesc executate

refăcutul zidăriei la ferestrele măriți și
cercușul la loc de vecinilor casă de piatră
și, refăcându-se la loc. și cum au
fost în după cum se vede la cele obținute
într-o astupătură cu zidărie.

Desfăcutul zidăriei $6 \times 0.14 \times 0.14 \times 1.20 = m.c. 4.126$ Lei 800 = 100 -

refăcutul cercușelor de piatră și fixarea
cu mortar de ciment și feră de fier bur. 4 x 1000 4000 -

refăcutul de zidărie nouă - circa m.c. 0,500 x 8000 4000 -

micușii noi cu mortar de var gros. circa mpr. 3 - x 500 1500 -

Total Lei 9600 -

în pământ din nou dubla din lemn de
șed cu tace de stejar, presă bine cu testă
și în pământ necesară, gârânișul și dăru
chiară ori în culșoare de ulei în turnul
Tombur. Tocul de lemn de stejar nu
va da în culșoare de ulei ci numai în
lei de fier simplu fără culșoare.
Lucrările templelor vor fi executate în pământ
la fața locului dimensiunile pentru
ce se ferăște în parte. Locul de

De reportat . . .

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFETE
Cubi sau greutate

P R E T U L

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

m.p. totuș asigat la lee. - $6 \times 0,60 \times 1,60 =$ m.p. 5,76 cs 6 - 10500 63000 -

Giamuri semiduble simple ne colorate
sau cu desene, complet asigat la lee
cu sfatul necesar. -

m.p. 12 - 400 4800 -

Curățitul coloanelor de piatră din interior
de culoarea de leu care a fost dat
în trecut și care ocazional primumet
lor, cu o soluție de acid clorhidric
sau cu o soluție de sodă caustică și cu
o feră de fier sau de fier (mătură) în
niciun motiv superior de sârma care
ar zgâria piatră. Se va spăla cu apă multă
luându-se toate măsurile de a se evita
ociduturile. Asemenea se va curăța cu
mai sus coșul de piatră al casei.

Locuștii în limita sumei de lei

~~Exila~~ Lucrător 3 zile x lei 1000 = lei 3000

Materiale, fier, apă etc. lei 5000

lei 8000

Taxe șelii. Beneficiu 30% lei 240

8240 cs.

8200 -

Desfocul celor trei roze de piatră
din părțile laterale și la Altar care au
fost ocazional cu tencușe și curățitul
lor complet de var și urină de var,
cu feră de fier și apă. - Ele vor rămâne
aparente și cu piatră naturală fără să fie
colorate cu var sau vopsele în culori. Asemenea
datul jos a tencușelor îndreptate de la
corpul Bisericii de la nivelul roșului
fără sul tocul ferestrelor, curățitul

De reportat . . .

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

P R E T U L

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

esterilor între cîmîmizi cu scobor de fier pe adăncimea de 2. cm. În pîr
e caprinole și cîrîșul mologului afiș
lui pîrșii cu corutele $3 \times 0.60 \times 0.60 = m.p. 1,08$
 $2,00 + 0,30 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 0,30 + 10,00 + 1,60 +$
 $1,50 + 1,70) \times 0,60 = m.p. 21,84$

m.p. 31,920.32- 350- 11200-

eficientul la loc al tuturor tencuilor
rotunde la corpul firencei (afși de cele care
se vor arăta că nu se vor mai face la
ozete) precum și în toate partile unde
se vor mîsca, din mortar de var gros și
nisip aspru, fără niciun amestec de
iment, care se aduce umed (și apă)
cîrșilor). Totul complet executat cu
aspectul arhitecturii firencei, trusul
profilurilor, dinșutul etc. -

m.p. 32- 600 19200-


la corpul firencei se vor păși toate
apfelile vechi cașite se vor spolia
fiserile tencuilor cîrșilor
se vor mîsca pe un se strica nimic
din profilele arhitecturii; la cornișe și
la pîrșii - Masurat desfurat

$0,55 + 15,00 + 0,30 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 0,30 + 10,00 +$

$60 + 1,60 + 1,60 + 3,00) \times 6,00 = m.p. 353,70$ 354. 15- 5310-

Locli la fotele cu laște de var și gresime
minimale (seu un cîrșii vegetal) de la
lună ori pîrșii la completa ocărire
și în culoarea pîrșii. Nu se va da
este cîrșii de pîrșii de la ferește sau
este roșetele de var, ele vor fi ocărite cu

De reportat . . .



ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

P R E Ț U L

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

bănză de roc și în cazul că vor fi
stăpânite cu vor fi imediat scutite
de feră de pai. Cășele de piatră
concretașă, piatră naturală
ocotit la m.p. măsurat de fațetă.
Golurile esecelor de la pînă vor se
vor scădea . . .

m.p. 354 50 - 17700 -

Trotuor în jurul pînăi din
lespezi de beton de ciment de 0.80/0.80
și 0.15 grosime și cu o reșea
armătură de fier; asfalt pe un strat
de nisip de 15 cm. grosime.
Lespezi vor fi încastrate 3 cm sub
tăcușoala trotuării și cu fante necesare
de scurgere apelor. Trotuorul nu
se va schimba în vîrstașă așezată cu
respectul de piatră conglomerată.
În preț se cuprinde și
nivelatul terenului și rostul cu
ciment, care nu va trece pe
marginile pietrei și nici nu se va fugi.
ocotit la m.p. lucru complet executat.

59.00 x 0.80 = m.p. 47- 1000 - 47000 -

Se dau nouă la intrare în fîșie din
lemn de stejar lucrat după un proiect
se va fi supus spre aprobarea Comis. Mun.
Totodată, completă deședă la loc, cu tot
lucrul necesar și dotul de domni ori
cu reșea de în fîșie fără culor. cuprins
tecul de lemn de stejar. 110 x 2.20 = m.p.

2,42 13.000 31560 -
Sei 217670

De reportat . . .

217670 -

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	671
nr. 244	f. 13

Primăria Comunei Belciugatele Plasa Brănești Jud, Ilfov.-



C E R T I F I C A T.

31 Mai, 1943.

N. 1818.....

Nei Ghicorghe St Moise Primarul, Comunei Belciugatele din
Plasa Brănești, Jud Ilfov,
Având în vedere cererea înregistrată la N.....

C E R T I F I C A M,

Că în cătunul Belciugatele de sus și în cătunul Belciugatel
e de jos și în cătunul, Gândeasca ce aparțin Comunei Belciu
gatelelor, un număr de (294) capi de Familii, cu un număr
de (1494) suflete.-

Drept pentru care am eliberat prezentul Certificat.-



Secretar,

București, 7 Iunie 1943.-



DOMNULE MINISTRU,

Subsemnații, Elena și Ing. Gheorghe Crețu și Florica și Gheorghe Fundănescu, proprietarii moșiei Cojești com. Belciugatele Jud. Ilfov avem onoarea a vă aduce la cunoștință următoarele:

Biserica din satul Cojești com. Belciugatele jud. Ilfov, în urma cutremurului suferind deteriorări grave nu mai corespunde unei normale funcționări.-

Subsemnații împreună cu locuitorii satului Cojești, luând inițiativa pentru repararea Bisericii am stabilit ca sătenii satului Cojești să pună la dispoziție pentru acest scop suma de circa lei 100.000.- una sută mii.

Untru'cât reparațiile ce vor necesita acestei biserici întrec cu mult suma de mai sus subsemnații ne obligăm a contribui cu diferența de bani până la completarea sumei necesare reparației.-

Dorind ca reparațiile să înceapă de îndată, vă rugăm, Domnule Ministru, a dispune să se delege un Domn Arhitect pentru facerea devizului și conducerea lucrării.-

Primiți, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.-

D-SALE

DOMNULUI MINISTRU AL CULTURII NAȚIONALE

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	CTI
Nr.	245 f 15

Domnului V. Moisescu
Conducator - Arhitect

1.463/943

16 JUL 1943 -

DELEGATIE

Sunteți delegat a cerceta biserica din satul
Cojești, com. Belciugatele Jud. Ilfov, întocmind de-
vizul de restaurări.-

p. MINISTRU,
Secretar General

Profesor Aurel Popa

Director,

V. Brătulescu

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	cm
nr. 27h	f 16

Domnului V. Moisescu
Conducător - Arhitect

1.463/943

16 JUL 1943.

DELEGATIE

Sunteți delegat a cerceta biserica din satul
Cojești, com. Belciugatele Jud. Ilfov, întocmind de-
vizul de restaurări.-

P. MINISTRU,
Secretar General

Profesor Aurel Popa

Director,

V. Brătulescu

COJESTI - JUD. ILFOV

3 file


Biserica A.M.D.

white ceiling


donor C.M.D. no. 274.

④

Bio. H. me. M. dei. S. m. l. n. i. r. d. i. l. l. e. n. a.
 A. n. t. i. c. o. p. e. s. t. C. a. n. n. e. l. g. i. n. g. e. t. t. i. -


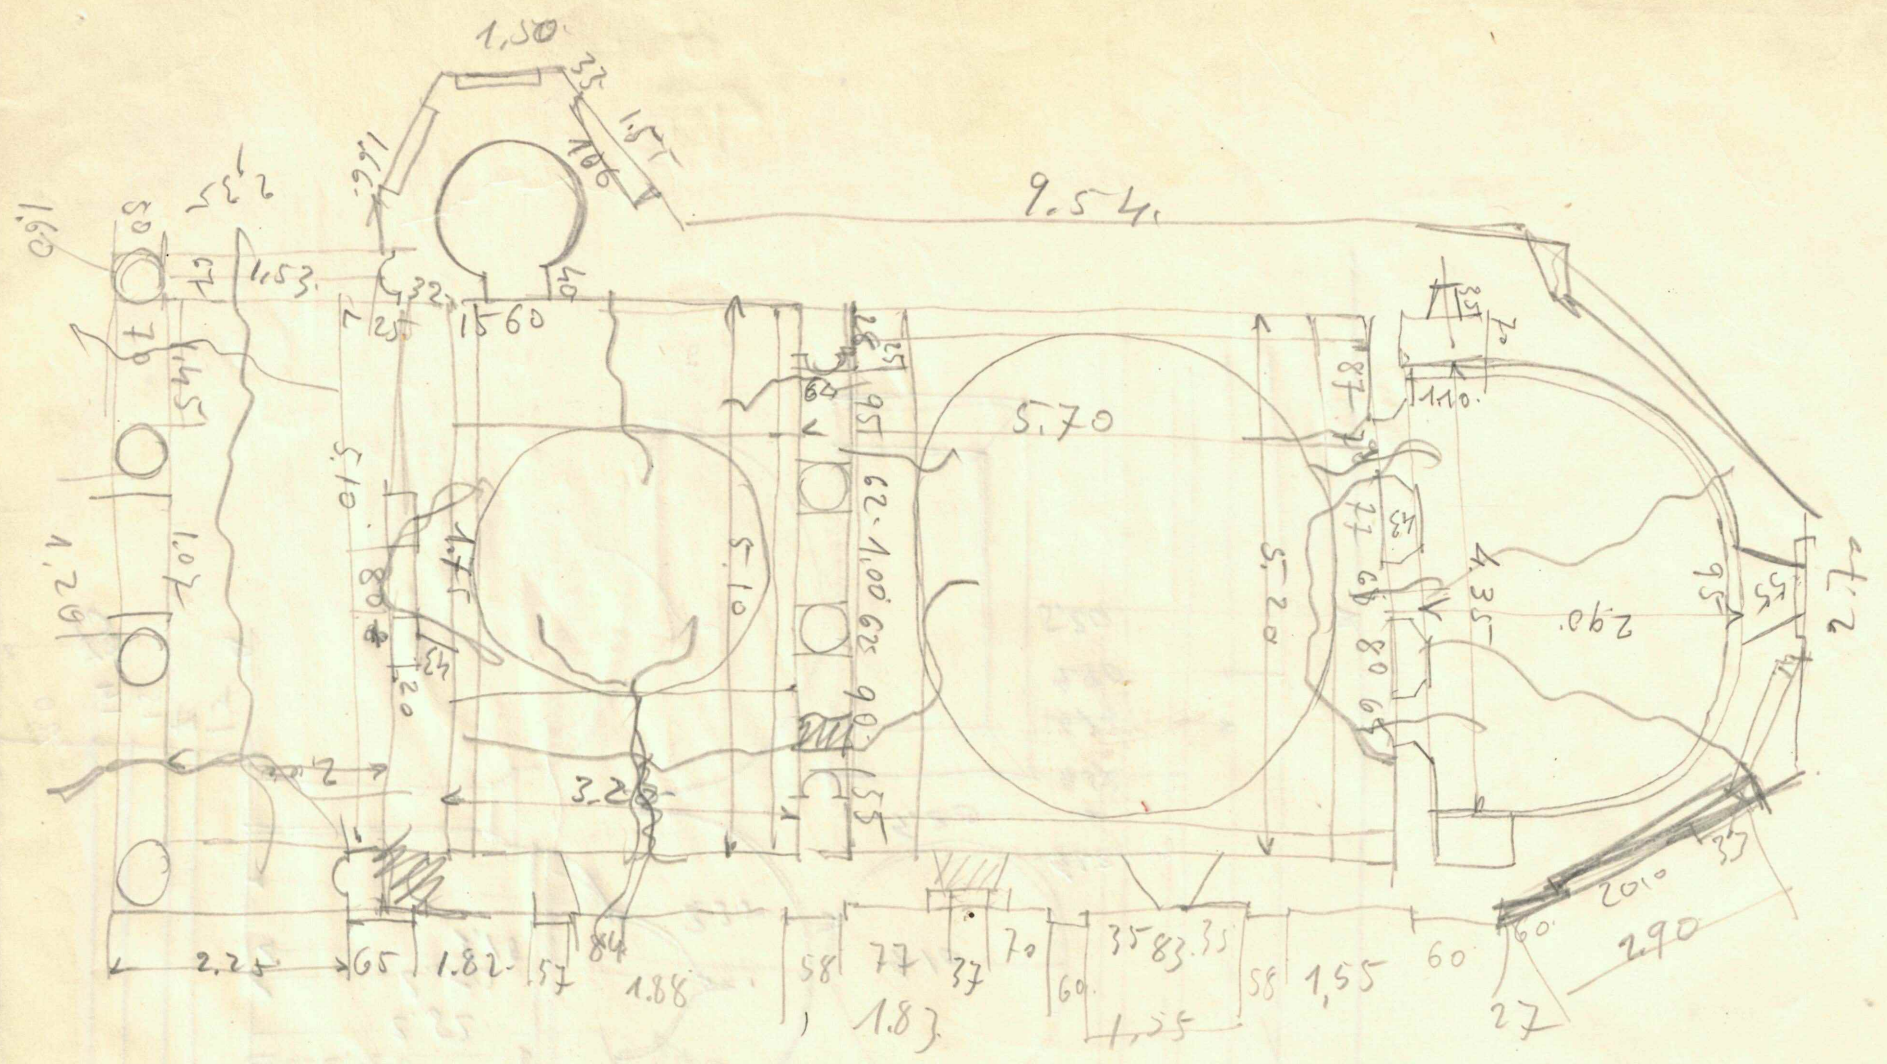


COTESTI 11F00

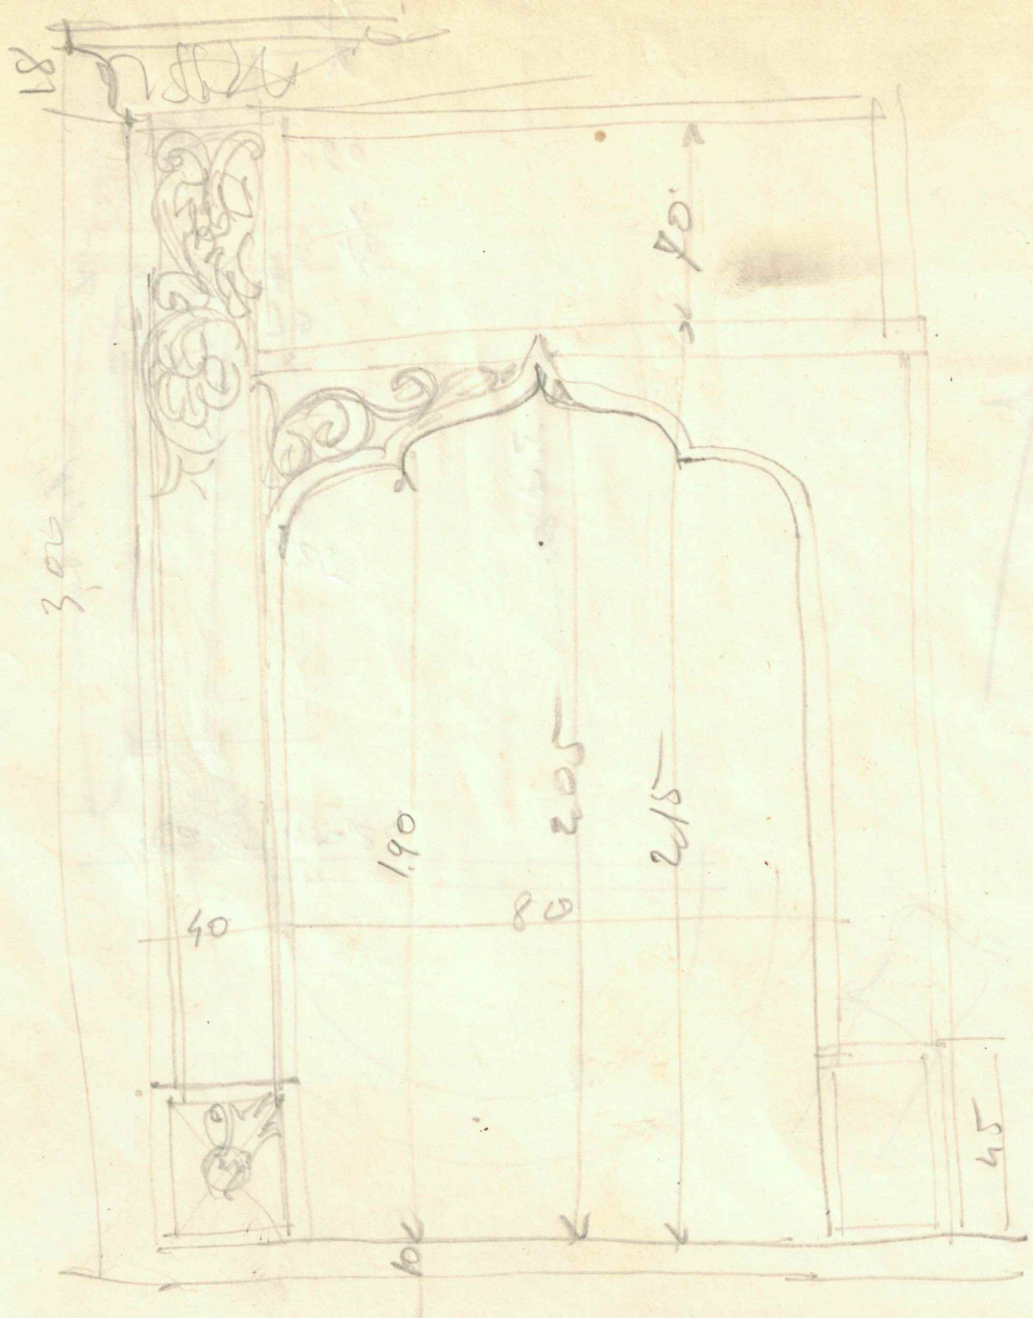


3.55
 265
 96

Empire Version
COTESTI LFCV

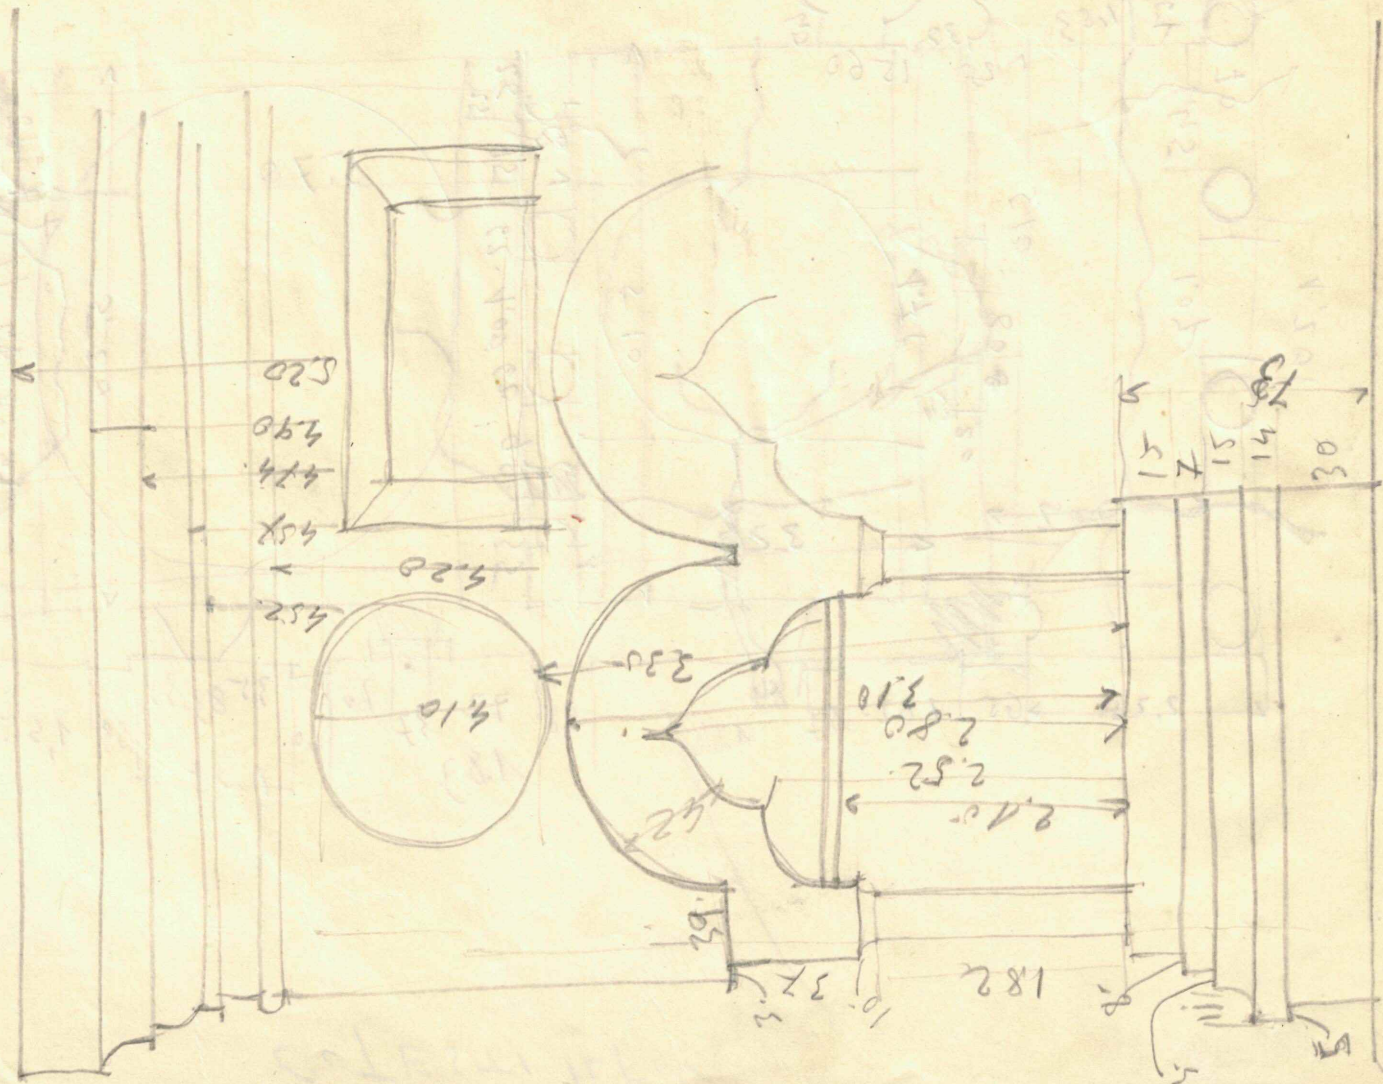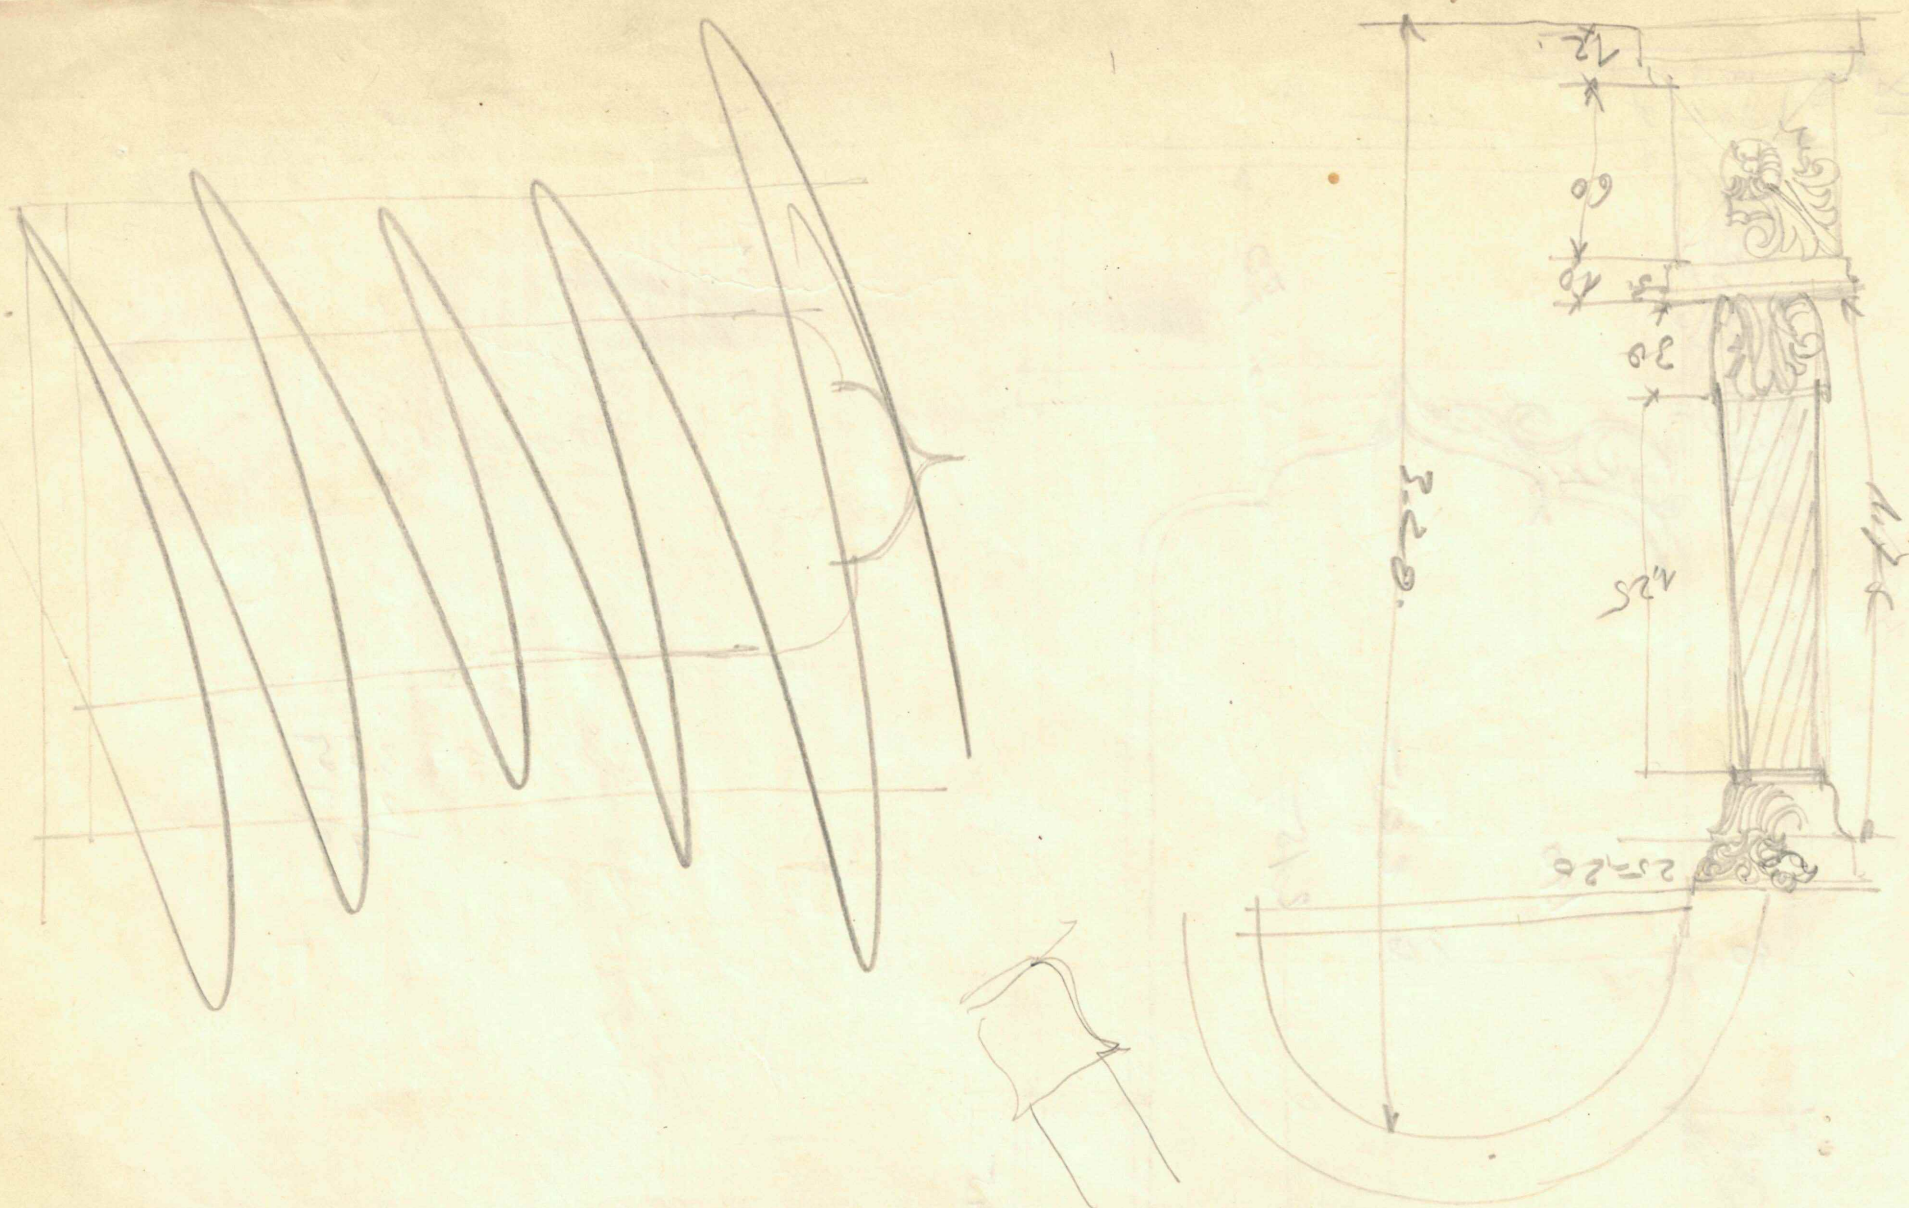

COLETTI LLEVO

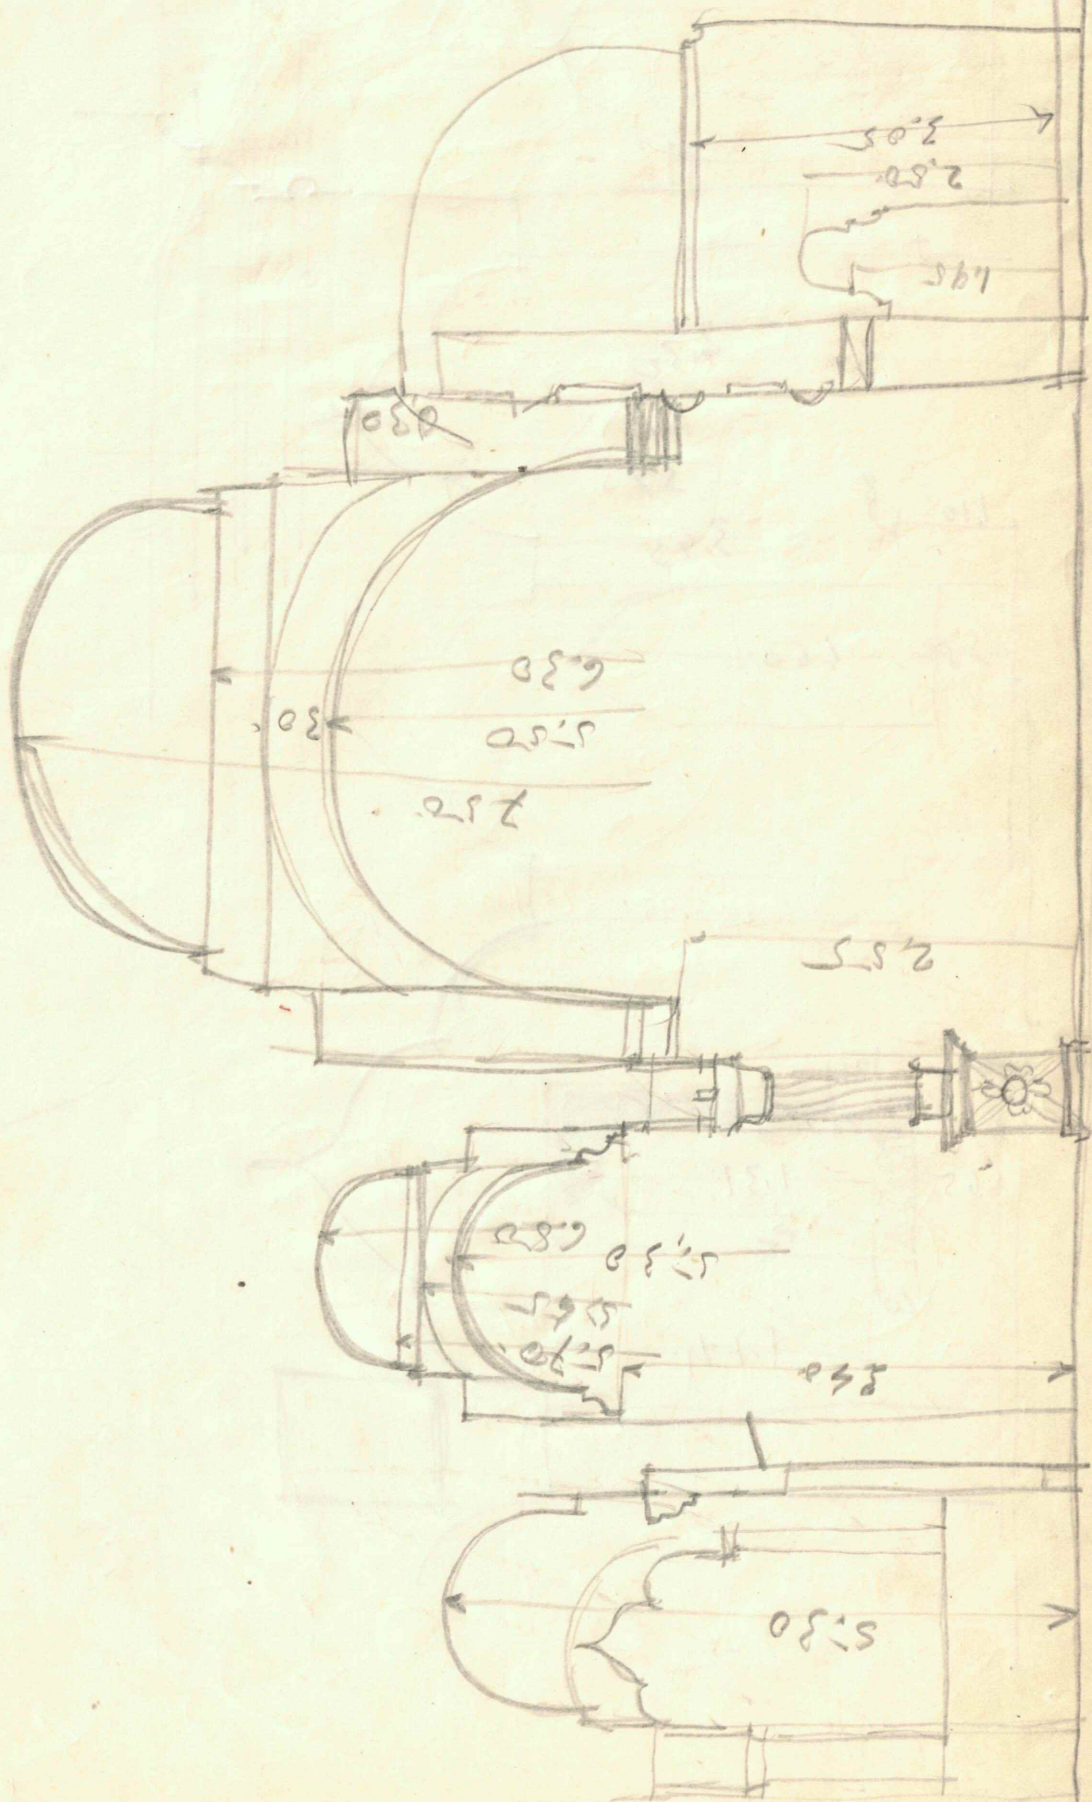

COJESTI 11.700

