

306

Nr. 2

de ordine din mapă.

109.

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1946

MAPA Nr. 2

FASCICULA Nr. 2

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Bicsorol

jud. Treiscaune (Covasna).

Bis. ssf. Gheorghe

1945-1946.

306

2 - 2 / 1945.

OFICIUL PAROHIAL ORT-ROM. BICSAD

Județul TREISCAUNE.

Nr:47 / 1945.



30 Oct. 1945

Tehnic

Situlu

Domnule Președinte,

In parohia Bicsad-Treicaune avem două biserici ortodoxe-române. Una zidită in anul 1940, iar cea veche este zidită din anul 1834, din piatră si cărămidă și este acoperită cu țiglă.

In Septemvrie 1944 trecând frontul peste aceste locuri, biserica cea veche a fost atinsă de o bombă sau grenadă, distrugându-i-se cca. 1/5. parte din acoperiș și din plafonul de scânduri pictate.

Intru cât această biserică ar forma un monument istoric, cu onoare Vă rugăm să binevoiți a dispune trimiterea la fața locului a unui arhitect pentru întocmirea devizului de reparaturi, pentru a putea face reparațiile absolut necesare, pentru a o feri de intemperiile vremii.

In cazul când această biserică din 1834. nu ar intra in categoria monumentelor istorice, cu onoare Vă rugăm, să binevoiți a ne da cuvenita aprobare, pentru a putea proceda la lucrările de reparații strict necesare așa după cum ne vom pricepe noi.

Sperând grabnică rezoluție cererii noastre, Vă rugăm Domnule Președinte, să binevoiți a primi asigurarea deosebitului nostru respect:

B I C S A D , la 20. Octomvrie 1945.

8. I. 946 Raport

1) Raportul delegatului Domnului V. Moiseșcu spre cercetarea monumentului, care, din punct de vedere al anului 1834, poate fi interesant.

2) Sunt de părere să se comunice Parohiei următoarele:

Comisiunea Parohiei

Ca răspuns la cererea

Nr. 47-1945, înregistrată la

Comisiunea Monumentelor Istorice Nr. 1881-1945 avem onoare să vă aducem la cunoștință că Comisiunea a dispus să trimită un delegat al ei să cerceteze biserica ortodoxă din Bicsad pentru a întocmi un deviz de restaurare. Cum din cauza timpului înaintat și a dificultăților de transport delegatul Comisiunii nu poate veni imediat în așteptarea lui vă rugăm să luați



Domnule Președinte
paroh.

MINISTERUL CULTELOR

toate măsurile necesare pentru a se refăcă șarpanta
învelitorii monumentului, în locul unde a fost par-
țial distrusă de bombardament, pentru a împiedea pătrunderea
apelor pluviale, fără însă a se aduce nici o modificare for-
melor vechi.

Arhitect Teodoru

Parohia Bicsad

Jud. Trei Scaune

1831/945

Ca urmare la rapertul Dvs.Nr.47/945,avem onoare

sa va aduce la cunostinta urmatoarele:

Comisiunea a dispus ca un delegat al ei sa cer-
ceze biserica ortodoxa din Bicsad pentru a intocmi un
deviz de restaurare.-

Deoarece din cauza timpului inaintat si a difi-
cultatilor de transport,delegatul Comisiunii nu poate
veni imediat,va rugam sa luati toate masurile necesare
pentru-ca sa se refaca șarpanta si învelitoarea monumen-
tului în locul unde a fost parțial distrusă de bombar-
dament, pentru a împiedica pătrunderea apelor pluviale,
fără însă a se aduce nici o modificare formelor vechi.-

DIRECTOR

V. Brătulescu

SEF DE BIROU

C. Levescu

D. M. A. S. I.
ARHIVA,
Colectia *Crui*
nr. 306 f. 2

PENTRU

repararea stricăciunilor cauzate de bombardament.


Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
1	Complexul în partea de Sud la învelitoare, fâșiei de cuprăvile, tălpile, șele, cărășuri, etc. pentru țigle, precum și oțelurile și cele pe care se vor găsi necesare a fi înlocuite și care au fost rupte de explozia bombelor, cu alte piese noi, din lemn de brad acoperit având oțeluri dimensiuni cu cele existente. - Totul lucrat complet cu toate fixările necesare, cușoare, buloane, etc. - Locat la m.c. cuprins scosul și șelul rupt -			2 -	4.300.000	8.600.000
2	Complexul țiglei și șelii la învelitoare cu țigle noi, etc. de cuprăvile având oțeluri dimensiuni și formă cu cele existente, cuprins locat la m.c. și șelul rupt cu șelul nou. Totul complet lucrat la corpul bisericii și țiglele clădită - Locat la m.p. circa m.p. -			50 -	416.500	20.825.000
3	Refacerea tavanelor de scânduri rupte de explozia bombelor, din scânduri noi de brad având oțeluri dimensiuni cu cele existente. Totul complet lucrat scândurile vor fi date la					
De raportat . . .						

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
	șindea și vor avea șipci la încheietura, cuprinsă distul de dacia ori cu bait și cu ulei de în fier.					
	$(10 \times 13.00) = 130. + 32.00 =$			162 -	165.000	26.730.000
				Lei		56.155.000
	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare				Lei	38.45.000
				Lei		60.000.000
	Adică peste zece milioane -.					
	Valoarea acestui deviz se va micșora în măsura în care Poșchia va procura direct și cu prețurile oficiale materialele necesare, fie materiale din clasație juri care să corespundă cerințelor tehnice și estetice prevăzute în deviz. Antepunându-se fiind obligat să primească aceste materiale pentru a se reduce prețurile înalte ale obiectului potrivit analizelor de prețuri înscrise acestui deviz -					
	Angajarea lucrărilor se va face cu respectarea Regulilor în legătură cu Transabilitatea Publică. -					
	Poșchia va înștiința C.M. Totuși de începerea lucrărilor și terminarea lor cerând relațiile necesare din timp. -					
				Intsemnit de		
				V. Marinovici		
				26 Martie 1947 -		
	27.3.947					
	Antut Horia Gabor					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
	sindea și vor avea pipei la iunctura cuprinsă distul de distanță cu cu bait și cu ulei de în fier. $(10 \times 13.00) = 130. + 32.00 =$			162 - 465000		26730.000
				Lei		56155.000
	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare			Lei		3845.000
				Lei		60.000.000
	Adică peste zece milioane -					
	Valoarea acestui deviz se va micșora în măsură în care Perahia va procura direct și cu prețurile oficiale materialele necesare, fie materiale din obiective juri care să corespundă cerințelor tehnice și artistice prevăzute în deviz. Antreprenorul fiind obligat să primească aceste materiale pentru a se reduce prețurile înalte ale obiectivelor participat analizelor de prețuri înveritate acestui deviz - Angajarea lucrărilor se va face cu respectarea Regulilor în vigoare a Contabilității Publice. - Perahia va institui C.M. Totuși de începerea lucrărilor și terminarea lor cerând relațiile necesare din timp. -					
				Intențit de		
				V. Moiseovici		
				26 Martie 1947 -		
	27.3.947					
	Artut Moiseovici					
	De reportat . . .					

2-2-1946.

Biserica Sf. Gheorghe
Bicsadul-Oltului
Jud. Trei Scaune



24/X.

1154/946

La raportul Nr.47/945, avem onoare a vă înainta devizul în valoare de 23.000.000 lei, necesar pentru restaurarea bisericii din acea comună, deteriorată de cutremurul din 1940.-

Vă rugăm să binevoiți a veghea ca aceste lucrări să se execute întocmai, anunțând Comisiunea de începerea lor și cerând lămuriri suplimentare la nevoie.-

Angajarea, executarea și plata se vor face cu paza tuturor dispozițiilor legale în vigoare, cum rinse în legea contabilității publice, publicată în Monitorul Oficial Nr.167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Monitorul Oficial Nr.174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice, publicate în Monitorul Oficial Nr.127/VI/931.-

Nu se aprobă nici-o modificare a lucrărilor prevăzute în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.-



DIRECTOR

V. Brătulescu

Conservator

N. Chioreanu

19.9.1946 Referat arhitectural la proiectul de proiectare și devizul de
23.000.000 lei întocmit de D. V. Năvrescu. Monumentul Jud. Tui Iosune -
ne prezentând în baza delegației au cercetat la foto
describită în-locului bisericii construite în 1854-55.
portanți arhi- Nu prezintă mult interes arhitectural
tectonici sunt nu are un plan aparte sau cadru de piatră
de părere că în sau pictură - . Treia este singura Biserică
mod excepțional ortodoxă într-o regiune complet secularizată
și poate admite cu bătăie biserică biserica a surselor și de la bombardament
cu bătăie biserică biserica a surselor și de la bombardament
și se referă tot serios și în jurul a surselor mai mult de
din scândur, la lacuitori comuni de alte confesiuni
având în vedere că în timpul a confesiuni 1940-1946, au
ci bătăie de fidare stricată într-un mod barbar astfel că
ar costa mult și sf. altar l. au transformat în claret
mai mult și public. -
ar cere repare. La revizuire Președintele Pop. D. Trifu. a
într-unul în cercetat a cercetat și face revizuirea, urm
acoperis care trebuie făcute reparațiile arătate în devizul
un pont cuprins în volade de lei 23.000.000 -
actualmente biserica nu a avut bolti de gîdare
obolă în plan teroare în scînduri așezate boltite
cîntre. pe tipuri de lemn. - dar a fost în
arhit. origină. Am făcut și a scînduri fente
Horiodoru a se vedea obolă este posibil a boltire în
21 Sept 1946 - aprobat
Se aproba refacerea fidaie. Ori ocazie ar costa foarte mult
20.9.1946 și ar trebui în plus schimbat și forma
Se aproba refacerea în vitezei care se strece aspectul cel vechi
boltă navei în lemn. Red că ră revizuire în forma originală cu
și cele l'alte lucrări timpul boltit cu scînduri așezate -
conf. de înălțimi alăturat calculat au arătat a vă revizuire revizuire
în valoare de 23.000.000 lei și devizul revizuit. Vă ră bine văită a
(douăzeci și trei mil.) dispune. -
P. Fulea
20 - Sept. 1946
Se aproba în proiectul arhitectural
Arhitect Horiodoru

AN TE-MASURA TOARE-DEVIZ

pentru

pentru repararea stricăciunilor cauzate de bombardament și lucrări de întreținere la biserica Sf. Gheorghe din Comuna Bicsadul-Oltului Județul Trei Scune.-

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Calentia
nr. 306
f. 5

- 1.-Complectatul căpriorilor rupți în partea de Sud la învelitoarea bisericei, a laților pentru țigle, a tălpilor, a tiparelor de scânduri, precum și înlocuitul tuturor pieselor ce se vor găsi rupte de bombardament, etc.- cu altele noi de lemn de brad, având aceleași dimensiuni cu cele vechi complet așezate la loc.- circa mc. 2 - 255000 = 510.000
- 2.-Indreptatul crucii dela clopotniță, care a fost strâmbată, fixatul ei de popul susținător, cu brățări și șuruburi din fier.- Global = 100.000
- 3.-Complectatul țiglei solzi la învelitoare cu țiglă nouă de bună calitate având aceleași dimensiuni și formă cu cele vechi complet așezate la loc. La turla clopotniță și corpul bisericei.- mp. 50 - 33300 = 1.665.000
- 4.-Refăcutul tavanului de scânduri boltit la fel cum a fost, din scânduri noi de 3cm. grosime date la rindea, lucrate în Nut și Feder, complet bătute în cuie pe tiparele de lemn, cuprins datul odată cu grund și de două ori cu baiț și ulei de înfierț.- mp. 162 - 31500 = 5.103.000
- 5.-Reparatul parapetului (balustrada) cofrasului corului, înlocuindu-se scândurile și piesele rupte de explozia granatei cu altele noi din același material lucrat la fel cu piesele existente, complet montat la loc, cuprins vopsitul în culoare de ulei dat de două ori. Global = 100.000
- 6.-Reparatul dușumelelor rupte la corpul bisericei și altar, cu scânduri noi la fel cu cele existente, complet bătute pe tufani existenți.- mp. 60 - 31500 = 1.890.000
- 7.-Reparatul scărilor din clopotniță înlocuindu-se părțile putrede cu altele noi din aceleași materiale cu cel existent.- Global = 300.000
- 8.-Scânduri la planșeele clopotniței de 4 cm. grosime complet, bătute pe grinziile existente.-mp. 13 - 31500 = 409.500
- 9.-Reparatul iconostasului (tâmplei) completându-se părțile lipsă cu altele noi din același material la fel lucrat cu cel existent, cuprins întăritul și revizuitul întregului iconostas.- Global = 300.000
- 10.-Tâmplărie nouă din lemn de brad cu toc de stejar lucrate cu cercevele duble la ferestre și ușa simplă la fel lucrată după același existentă.-Total complet așezat la loc cu toată fierăria necesară, grunduitul și datul de două ori în culoare de ulei în tonul stejarului natural.- mp. 16 - 138000 = 2.208.000
- 11.-Geamuri simple complet așezate cu chitul lor necesar.- mp. 24 - 22000 = 528.000
- 12.-Reparatul amvonului (predicator) completându-se zidăria căzută cu zidărie nouă din cărămidă bine arsă lucrată cu mortar de ~~maxxgraxxi~~ ciment și tencuțeli din mortar de var gras și 30% ciment complet drisăcuite cuprins reparatul treptelor scării.- Global = 200.000

ANTE-MASURATOARE-DEVIZ

pentru

pentru repararea stricăciunilor cauzate de bombardament și lucrări de întreținere la biserica Sf. Gheorghe din Comuna Bicsadul-Oltului Județul Trei Scaune.-

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	CRN
nr.	306 t. 5

- 1.-Complectatul căpriorilor rupți în partea de Sud la învelitoarea bisericei, a latilor pentru țigle, a tălpilor, a tiparelor de scânduri, precum și înlocuitorul tuturor pieselor ce se vor găsi rupte de bombardament, etc.- cu altele noi din lemn de brad, având aceleași dimensiuni cu cele vechi complet așezate la loc.- circa mc. 2 - 255000 = 510.000
- 2.-Indreptatul crucii dela clopotniță, care a fost strâmbată, fixatul ei de popul susținător, cu brățări și suruburi din fier.- Global = 100.000
- 3.-Complectatul țiglei solzi la învelitoare cu țiglă nouă de bună calitate având aceleași dimensiuni și formă cu cele vechi complet așezate la loc. La turla clopotniță și corpul bisericei.- mp. 50 - 33300 = 1.665.000
- 4.-Refăcutul tavanului de scânduri boltit la fel cum a fost, din scânduri noi de 3cm. grosime date la rindea, lucrate în Nut și Feder, complet bătute în cui pe tiparele de lemn, cuprins datul odată cu grund și de două ori cu baiț și ulei de în fierț.- mp. 162 - 31500 = 5.103.000
- 5.-Reparatul parapetului (balustrada) cofrazului corului, înlocuindu-se scândurile și piesele rupte de explozia granatei cu altele noi din același material lucrat la fel cu piesele existente, complet montat la loc, cuprins vopsitul în culoare de ulei dat de două ori. Global = 100.000
- 6.-Reparatul dușumelelor rupte la corpul bisericei și altar, cu scânduri noi la fel cu cele existente, complet bătute pe tufani existenți.- mp. 60 - 31500 = 1.890.000
- 7.-Reparatul scărilor din clopotniță înlocuindu-se părțile putrede cu altele noi din aceleași materiale cu cel existent.- Global = 300.000
- 8.-Scânduri la planșeele clopotniței de 4 cm. grosime complet, bătute pe grinziile existente.- mp. 13 - 31500 = 409.500
- 9.-Reparatul iconostasului (tâmplei) completându-se părțile lipsă cu altele noi din același material la fel lucrat cu cel existent, cuprins întăritul și revizuitul întregului iconostas.- Global = 300.000
- 10.-Tâmplărie nouă din lemn de brad cu toc de stejar lucrate cu cercevele duble la ferestre și ușa simplă la fel lucrată după același existentă.- Totul complet așezat la loc cu toată fierăria necesară, grunduitul și datul de două ori în culoare de ulei în tonul stejarului natural.- mp. 16 - 138000 = 2.208.000
- 11.-Geamuri simple complet așezate cu chitul lor necesar.- mp. 24 - 22000 = 528.000
- 12.-Reparatul amvonului (predicator) completându-se zidăria căzută cu zidărie nouă din cărămidă bine arsă lucrată cu mortar de ~~maxxgraxxi~~ ciment și tencuieli din mortar de var gras și 30% ciment complet driscuite cuprins reparatul treptelor scării.- Global = 200.000
- 13.-Batal jos a tencuielilor soclului, curățatul rosturilor între cărămizi și pietre, cuprins rostuitul cu mortar

de var gras fără ciment.-Socul rămâne aparent nu se va mai tencui dându-se astfel posibilitatea umezelei să iasă în afară și să se usuce.- mp. 58 - 11000 = 638.000

14.-Curățatul tencuielilor interioare în locurile unde sunt umezite și burdusite, cuprins curățatul rosturilor și retencuitul cu mortar de var gras și nisip aspru, fără ciment, complet drisuite.- mp. 51 - 11000 = 561.000

15.-Inlocuitul cărămizilor putrede dela soclu cu altele noi de bună calitate bine arse lucrate cu mortar de var gras simplu, cuprins scosul celei vechi.- circa buc. 300 - 2400 = 720.000

16.-Trotuar în jurul bisericiei lat de 0,60 m. din lespezi de piatră locală neregulată, așezată pe un strat de nisip gros de 15 cm., cuprins rostuitul cu seamă de ciment și săpătura de pământ.- mp. 60 - 37000 = 2.220.000

17.-Acoperitul Sf. Vese a Altarului în scânduri de lemn de stejar date la rindea, cu ramă complet așezată la loc.- mp. 3 - 31500 = 94.500

18.-Crăpăturile pereților la Altar și pe latura de Nord, se vor desface cu scoaba de fier, spăla bine cu apă multă și turna în ele seamă de ciment cu puțin var gras, treptat până la umplerea golului crăpăturii.- În preț se cuprinde tot materialul, cuprins mâna ce lucru și refăcutul tencuielilor în dreptul crăpăturii cu mortar de var gras și 30% ciment complet drisuite.- ml. 16 - 15800 = 241.200

19.-Jgheaburi cu aruncători din tablă galvanizată de 45 kgr. la legătură, complet așezate cu cârligele de fier galvanizat și lipiturile de cositor.- ml+ 70 - 19000 = 1.330.000

20.-Reparații de tencuieli exterioare în locurile unde se va găsi de cuviință, sau unde sunt căzute și burdusite, cu mortar de var gras și nisip aspru fără ciment, complet drisuite.- circa mp. 100 - 11000 = 1.100.000

21.-Spoleli exterioare cu lapte de var gras și grăsime animală (rece) dat de două ori până la completă acoperire, cuprins respoitul celor vechi și spocluitul fisurilor.- mp. 450 - 2000 = 900.000

Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare
Total 20.638.700
2.361.300
23.000.000

Adică douăzeci și trei milioane lei.-

Prețurile sunt cele oficiale însă având în vedere eventualele dificultăți cu procurarea materialelor, transporturi, găsirea mânei de lucru calificată, etc., este posibil ca lucrarea să treacă peste cota prevăzută de 20%.- În cazul când prețurile nu mai corespund cu costul pieței în momentul când se va executa lucrarea parohia se va adresa în scris Serv. Tehnic Județean singurul în măsură a cunoaște prețurile locale și de a avea controlul la și pentru materiale, transporturi, etc.-

Intocmit de
(ss) V. Moisesescu

13 Sept. 1946

p. conformitate

Em. n. n. n.

Biserica „Sf. Gheorghe” Comuna Bicsod-Cluj. Jud. Tulcea.

ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU


repararea stricăciunilor cauzate de bombardament — și necesii de întreținere. —

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
1)	Complectatul coprișurilor după în- partea de sud. la învelitoare biserică; a lătilor pentru țigle, a tălpilor și a scândurilor scândurii, picurii și subacuitul tuturor pieșelor ce se vor găsi după de bombardament etc. — cu altele noi din lemn de brad. având oclăsi dimensiuni cu cele vechi complect așezate la loc. — circa m.c.			143 2 -	255000	510000
2)	Închepătul crucii de la clopotniță, care a fost strâmbă, fisurată și de păpușă sustinător, cu brățari și suruburi din fier. — Globul fier. —					100 000
3)	Complectatul țiglei roșii la învelitoare cu țigle noi de bună calitate având oclăsi dimensiuni și formă cu cele vechi complect așezate la loc. la tiera clopotniță și corpul bisericii. — m.pr.			50 -	33500	1665000
4)	Refăcutul tavanelor de scânduri bătut la fel cum a fost, din scânduri noi de 30 m grosime date la rind, lăcuite în ulei și tencuie. complect bătut în cuie pe tipurile de lemn cuprins, datul adăta cu grind și de lăcuș ori cu bait și ulei de în- fiert. — $10 \times 13,00 \times 32,00 =$ m.pr.			162 -	31500	5100000
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
5	Reparatul parașetului (bolushka) ^{Report} capetului corului, înlocuindu-se scândurile și piesele rupte de explozia granatelor cu altele noi din același material decât la felăpișele existente existente, complet montat la loc; cuprins vaporitul în culeșor de ulei dat de oleum ori - global lei -					100.000
6	Reparatul dusemelor rupte la corpul pînice și altor, cu scânduri noi la fel cu cele existente complet dotate pe treburile existente. - m.p.	60	31500	-1890000		
7	Reparatul georilor din clăpatrită înlocuindu-se partile putrede cu altele noi din același material cu cel existent. - global lei -					30.000
8	Scinduri la plaușiele clăpatrite de 4 cm. grosime complet dotate pe grinzile existente $3 \times 2.00 \times 2.20 =$ m.p. Cr.	13	31500	409500		
9	Reparatul Tevastasului (Tamples) completându-se partile lipsă cu altele noi din același material la fel lucrat ca cel existent, cuprins interiorul și exteriorul interiorului Tevastos. - global lei -					300.000
10	Teraplaza nouă din lemn de Brod. cutie de sticlă lucrată cu cercevele duble la ferestre și uși simple la fel lucrată după ocaz existenta. Totul complet pregăt la loc cu toate fișele necesare, ghidul și dotul de oleum ori în culeșor de ulei interior sticlăriei natural - Terestra $9 \times 0.75 \times 1.70 =$ m.p. 11.43. Uși $1.40 \times 2.20 =$ m.p. 3.08 „ clăpatrite $1.50 \times 0.90 =$ m.p. 1.30 15,81 CS.	16	138000	2208000		

De reportat . . .

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
11	Legumii simple complet asezate cu cărțile lor necesare — m.p. —			24 —	22.000	528.000
12	Reparatul amvonului (predicator) complectându-se cu gidoane coștate cu gidoane noi și cu cărămizi bine ase și lucrate cu mortar de ciment și tencueli din mortar de var gros și 30% ciment complet chisuite cuprins reparatul tulpilor scari — Gălbui lei —					200.000
13	Dotul pe o tencuie la poartă cărțile rosturilor între cărămizi și pictură cuprinsă rosturile cu mortar de var gros fără ciment. Locul rămas afectat nu se va mai tencui din nou și celălalt posibil tot așa ambele și care în afară și în se usuce. $2,00 + 3,00 + 2,40 + 14,00 + 0,80 + 2,80 + 2,20 +$ $1,70 \times 2 \times 1,00 =$ m.p. — 57.80 cr. m.p. —			58 —	11.000	638.000
14	Cărțile tencuie la interioare în locurile unde sunt umedite și burdușite, cuprins reparatul cărților rosturilor și tencuie cu mortar de var gros și nișă aspră, fără ciment, complet chisuit — $(3,00 + 13,00 + 1,00 + 2,70 + 2,00 + 1,60 + 1,90) \times$ $2 \times 1,00 =$ m.p. 50;40 cr. m.p. —			51 —	11.000	561.000
15	În locurile cărămizilor putredă de la poartă cu alte noi de bună calitate bine ase și lucrate cu mortar de var gros simple cuprins peșul celei vechi și peșul nou. 300 — 2400 —					720.000
16	Trotuar în fața Bisericii la de 0,60 — din leșezile pietre locale nereglate asezate pe un strat de nisip gros de 13 cm. cuprins rosturile cu grăunțe de ciment — m.p. — și repartizarea de grăunțe.			60 —	37.000	2.220.000
17	Acoperitul Sf. Mărie a Altarelor					
	De reportat					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
18	în acordieri de lemn de stejar plat la pîndea, cu ramă complet așezată la loc. m.p. 300 Grăpăturile peretilor la Altor și pe lătura de Nord, se vor desface cu scările de fier spalo bine cu apă multă și turna în ele zărmă de ciment cu puțin var gras. treptat până la umplerea golului crafăturii. Se prel se cuprind tot materialul cuprin mănu de lucru și refăcutul tencuieilor în cheptul crafăturii cu mortar de var gras și 30% ciment complet discutate. 4 x 4.00 = m.l. m.l. 16 - 15800 241200					
19	Lăptăviri cu onucatori din table golăruizate de 4.5 kyp la legătura complet așezate cu corijele de fier golăruizat și lăptăviri de caritor m.l. 70 - 19000 1330.000					
20	Reforți de tencueli ceteroare în locurile unde se va gori de curvitate, sau unde sunt cărute și burdușite, cu mortar de var gras și nisip uscat fără ciment, complet discutate. circa m.p. 100 - 11000 1100.000					
21	Speli ceteroare cu lopți de var gras și gresime animală (seel) doi de doi de pînă la completă acoperire. cuprin raportul celor veci și spăritul finisilor. m.p. 450 - 2000 = 900.000					

Adică


Divise reprezentate ce se vor plăti la execuție lei 20638700
2361300
23000000

Făcută de subsemnatul, în Adică douăzeci și trei de milioane —
Puteaua sunt cele aficiole nău având în vedere eventuale dificultăți
cu procurarea materialelor, transporturi; găsirea muncii de lucru calificată
etc. este posibil ca lucrarea să treacă peste cota prevăzută de 20% —
În cazul când puteaua nu mai corespund cu costul pieței în momentul
când se va executa lucrarea Porocă se va adărea în serie. m.p. Tehnic
Judetene singurul în măsura a cunoscuta puteaua locale și de
a avea controlul la zi pentru materiale, transporturi, etc —

19.9.946 Ghift
Horia Codon

Intamit de
13 Sept 1946

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR <i>Analiza Preturilor</i>	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
Art 1	Lemn 1 m.c. lei 140.000 Lucru ore $10 \times 1500 =$ lei 15.000 Apulor „ $10 \times 1000 =$ lei 10.000 Ferare kg. 1 $\times 4600 =$ 4600 Lei 169.600 Cheltuieli și beneficiu 50% 84.800 Lei 254.400 c. 255.100					
Art 2	Global. —					
Art 3	Zolzi țigle buc. $60 \times 300 =$ lei 18000 Manopera ore $1 \times$ lei 1500 = lei 1500 Apulor „ $1 \times$ lei 1000 = lei 1000 Cuc „ $0,10 \times$ lei 4500 = lei 450 Mortar Lei 1200 Lei 22150 Cheltuieli și beneficiu 50% lei 11075 Lei 33225 c. 33300					
Art 4	Scanduri $0,03 \times$ lei 160.000 = lei 4800 Cuc kg. $0,20 \times 4500 =$ lei 900 Țăit și rubi Lei 12000 Manopera ore $1 \times$ lei 1500 = lei 1500 Apulor „ $1 \times$ lei 1000 = lei 1000 Vopsitor ore $0,5 \times$ lei 1500 = lei 750 Lei 20950 Cheltuieli și beneficiu 50% 10475 Lei 31425 c. 31500					
Art 5	Global.					
Art 6	egal art 4.					
Art 7	Global. —					
Art 8	egal art 4 și 6					
Art 9	Global.					
Art 10	Lemn m.c. $0,15 \times$ lei 160.000 = 24000 Manopera ore $20 \times$ lei 1500 = lei 30000 54.000 Ferare, vopsit și mantolul 70% = 37800 De reportat Lei 91800 Cheltuieli și beneficiu 50% lei 45900 Lei 137700 c. 138000					
Art 11	costul pietre					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
Art 12	global .					
	Report . . .					
Art 13	Lucrător ore $1 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 1000$.					
	Mortor Lei 5000.					
	Manopera lucrărilor ore $0,5 \times \text{lei } 1500 = 750$					
	ajutor . . . $0,5 \times \text{lei } 1000 = 500$.					
	Lei 7250					
	cheltuieli și beneficiu 50% lei 3625					
	Lei 1087500. 11.000					
Art 14	egal art 13 — .					
Art 15	Coramizi luc. - $1 \times \text{lei } 100 = \text{lei } 100$					
	Manopera - ore $0,5 \times \text{lei } 1500 = \text{lei } 750$					
	Mortor lei 750 —					
	1600					
	cheltuieli și beneficiu 50% 800.					
	Lei 2400					
Art 16	piatră laolă Lei 18000					
	Manopera ore $1 \times 1500 = \text{lei } 1500$.					
	ajutor . . . $1 \times 1000 = \text{lei } 1000$					
	sofetura Lei 1000.					
	chisori - Lei 220.					
	țencuie de ciment lei 3000.					
	Lei 24720					
	cheltuieli și beneficiu 50% lei 12360					
	Lei 37080 37.000.					

Art 17 egal art 4.

Art 18 Căpătare la țencuie de ciment. Lei 5000.

Manopera ore $1 \times \text{lei } 1500 = \text{lei } 1500$.

Făcută de subsemnatul, în ajutor $1 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 1000$.

Țencuie Lei 3000.

cheltuieli și beneficiu 50% lei 10500

5250.

Art 19 tabla m-p. $0,40 \times 18.000 = \text{lei } 7200$ 15750 15800.

Canitor Lei 3000.

Manopera $1 \times \text{lei } 1500 = \text{lei } 1500$.

ajutor $1 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 1000$.

cheltuieli și beneficiu 50% lei 12700

6350.

Lei 19050 19.000

2.


[illegible]

2-2-1946.

Exp. 17/X.

2-2/1946.

Ministerul Cultelor
Direcția Contabilității



1129/946

Avem onoare a vă înainta în original cererea Nr.108/946 a Oficiului parohial Ortodox-român din comuna Bicsad Jud.Treiscaune, completată cu referatul d-lui V.Moisescu conductor arhitect la Comisiunea Monumentelor Istorice, rugându-vă să binevoiți a-i aproba un ajutor bănesc.-



DIRECTOR

V. Brătulescu

Conseruator

N. Chioreanu

Chi
V. Moisescu

2-2-1946

1831/1945

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	crn
nr. 306	f. 11

DELEGATIE

Sunteți delegat a merge în *Comuna Priesac*
..... județul *Irei Seauve* pentru a
cerceta biserica *Ortodoxă română zidită la 1834.* -
din localitate, referind și întocmind planurile și desenele
necesare lucrărilor de restaurare. -

Ca ocazie veți cerceta și celelalte monumente
istorice din localitate, referind asupra nevoilor lor de
restaurare. -

DIRECTOR

V. Brătulescu

SEF DE BIROU

Z Levescu
C. Levescu

~~BICSAD~~ - TREI SCAUNE

[x]











jud.

2 file

Bis. Sf. Gheorghe

Solite releveu, cca 1946.

Donor C.H.I. nr. 306.

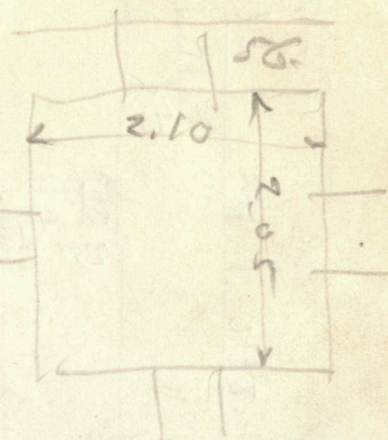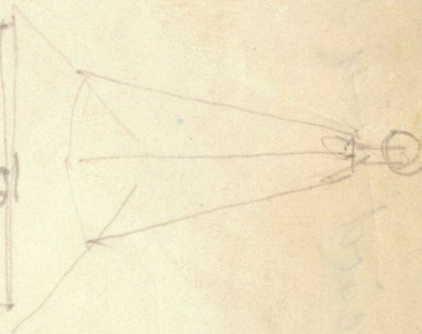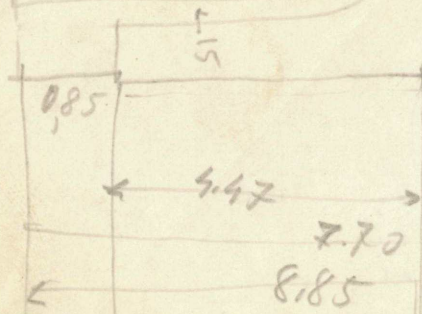

- ~~1) Sochi rep de rucicola~~
- ~~2) Sarpanta de rucicola~~
- ~~3) Repat. Juculito area~~
- ~~4) Tencu la intanarea~~
- ~~5) Tencu la de scandia din rucicola~~
- ~~6) Rep coforului conului~~
- ~~7) Clapetura repat scaule si flisale~~
- ~~8) Tencu la si rucicola si gauri~~
- ~~9) Repat anuanel~~
- ~~10) Repat dinuanel~~
- ~~11) Tencu la si rucicola si gauri~~
- ~~12) Masa si Alter~~
- ~~13) Proscamole~~
- ~~14) Janosternul de repat~~
