

430

Nr. _____ de ordine din mapă.

5.04

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 194~~4~~

MAPA Nr. 24

FASCICULA Nr. 6

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Bis. Parohiei Branistea

Goanta - bis sf. Voerogi

Iul. Mehedinți


430

~~508~~

Chestionar

privitor

La Monumentele Istorice.



Județul Mehedinți.

Comuna Branistea

Căminul Goanța, Biserica filială cu hramul
„ Sf. Voerozi ”

Biserica filială din căminul Goanța este de zid și cu sămuri și este sfințită în anul 1919 în ziua de 3 Noembrie. Construcția acestei biserici a început în anul 1911. Ctitori cari au avut binecuvântarea Sf. Episcopii de-a aduna ofrande au fost locuitorii: Ion Popera, Nicolae I. C. Enea și Dumitru Gh. Mocofan.

4. La intrarea în Biserică se găsește următoarea inscripție zugrăvită: « Cu vrea Tatălui, cu împreună lucrarea Fiului și cu desăvârșirea Sf. Duh, Sădită - Să această Sfântă și Dumnezeuască Biserică din temelie care prăsniește hramul Sf. Voerozi și Să înfrumusețat cu zugrăveala și alte odore sfinte, prin nevointa și cheltuiala credincioșilor creștini ai obștei din satul Goanța, ajutând și alți credincioși din satele vecine și Să sfințit de prea Sfințitul Episcopul nostru S. S. Slerie al Râmnicului Nouului-Severin în ziua de 3 Noembrie în al 1^{le} au de arhiepiscopie, în zilele prea slăvitului nostru Rege Ferdinand al României în al 5^{lea} au de slăvita Domnie ».

5. Clădiri sau ziduri în jurul bisericii nu sunt.

6. Biserica are în față un pridvor fără stâlpi, acoperit cu sticlă colorată.

7. Pietre de morminte vechi pe lângă biserică nu sunt.

8. Zugrăveala bisericii este nouă din 1915 și 1916 și este zugrăvită numai pe din lăuntru.

9. Tămpla este de ~~lemn~~ și este frumos zugrăvită.

10. Biserica are 2 sfetnice vechi, simplu lucrate.

11. Scoane vechi în biserică nu sunt.

12. Se găsește o cădelniță veche, un chirot lucrat din tinichea, un potir și un disc vechi, fără nici o inscripție.

- 13.-14. Vestimente, pomelnice și documente vechi nu sunt.
15. Cărți vechi de ritual se găsesc următoarele: O Evanghelie tipărită în anul 1859, 12 minie din anul 1852, Un pentecostar și un triod din anul 1855, un Kiriacodromion din anul 1855, Un octoich mare din 1825, un octoich mic din 1862, un liturghier din 1862, o psaltire din 1811, 2 molitfelnice cărora le lipsește coperta cu data tipăririi, un catavasier din 1872.
16. Clopote vechi nu sunt, cele ce au fost s'au luat de către trupele de ocupație Austro-Germane.
17. Până la 1911 când s'a construit actuala biserică a cătunului Goanta din nou, exista în locul acestei biserici o biserică de bărne. Aceste bărne le-au adus locuitorii cătunului Goanta din comuna Salcia din Mehedinti cu carele, cam pe la anul 1866. Înainte de acest an, după spusele unor locuitori mai bătrâni biserică era așezată într-un bordeiu. Locul unde a fost acest bordeiu se observă și astăzi fiind o groapă mare în spatele actualii biserici. Când s'a construit la 1911 biserică aceasta bărnele ce erau ~~în~~ în cea veche s'au dat maistohilor ca să lucreze din fid pe cea de acum. Acești maistohi sau lucrători au luat pe lângă bărne și toată lemnăria precum și toate icoanele vechi.
18. Legende istorice nu se povestesc despre acest f. Locas.
19. În jurul bisericii nu sunt lucruri istorice.



Prof. P. H. Popescu

Branistea Just. Mehedinti

H. Vaenzi de ziol


Cestromer mare

Anouel C.B. 1909 wrote anul 1807

W, are uleni

" fotuzes

24-6 / 1946.



Parohiei Branistea
Jud. Mehedinti.

24 JUL

940/1946

Cucernice Părinte,

La Nr. 27/946 înregistrat la Nr. 940/946, avem onoare a vă aduce la cunoștință că în ziua de 15 Iulie s'au expedit cu Nr. 813 și instrucțiunile sistem Knapen, care numai din eroare n'au fost anexate devizului modificat și aprobat de Comisiune.

Domnul Arhitect Costescu, fiind în concediu până la finele lunii, vă rugăm să începeți lucrările cerând prin corespondență lămuririle suplimentare de care aveți nevoie pentru a se evita întârzierile.



DIRECTOR,

X. Brătulescu
Brătulescu

Conservator,

N. Chioreanu
N. Chioreanu

24-6-1946.

Parohia Branistea
Jud. Mehedintz
Nr. 27.

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia *oru*
nr. 430 f. 3

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL. CULTELOR
Nr. 0940 + 15 JUL 1946 +
COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE

1946 Iulie 10

Sistemul Knapsen
s'a expediat cu
Teu 813 in ziua
de 15 Iulie.
M. Barca.

Onot.

Comisiunea Mon. Istorie, Bucuresti,

Ca urmare adresei dv. Nr. 813/946, prin care
ne maroiați derizul pentru reparatia Bisericii
modificat in vederele comisiei, va incunostintam
ca, - din eroare credem - ati omis sa ne trimi-
teți Instructiunile „Sistemul Knapsen”, pentru scara
terea igriasiei din soclul Bisericii, fara de
care nu se poate intocmi derizul, conținând
modificari facute de dv. Pentru
aceasta, va rugam sa bunvoiti a ne transmite
coit mai repede cu putinta aceste instruc-
țiuni, fiindca altfel, pierdem sezonul de
lucru, pina sa fim gata cu indeplinirea
formalitatilor.

19 VII 1946
la dosarul la Tehnic
V. Strelu

19.7.946 Sunt de
parere si de ras-
punde
Lucian Parinte
la Nr. 27-946 inregis-
trat la Nr. 940-946

Avem nevoie a va
aduce la cunostinta
ca in ziua de 15
Iulie s'au expediat
cu Nr. 813 si instruc-
tiunile sistemul
Knapsen, care
nu au fost anexate
derizului si
modificat si aprobat
de Comisiune.

Cum unele modificari facute de dv. nu
pot fi intocmai executate, din cauza situatiei
de fapt a terenului pe care se afla cladita
Biserica, si pentru ca sa putem face o
treaba buna, va rugam foarte stăruitor
sa bunvoiti a ne trimite la fata locului
pe cel Arhitect Em. Costescu. Atunci vom
avea siguranta ca incepem si facem un
lucru in cele mai bune conditii. Fie ca
una este sa scrii pe hartie, fara sa fi la
fata locului si alta este sa fi la
fata locului, unde vezi tot ce are te-
răzirea si unde se poate vedea si
lucrarile cerand prin corespondenta lucrari
si implementare de lucrari noi pe teren

vointa enoriasilor, dela care trebuie să ob-
ținem fondurile pentru reparatia Bisericii.

În numele parohiei, deci, încă o dată vă rugăm
să binevoiți să ne trimiteți la față locului, cât
mai urgent pe Le. Arhitect Costescu, a cărui
deplasare, ne va servi pe noi Comitetul de
reparatie.

Președintele Comitetului,
Paroh Pr. C. Ghiescu

a se erita întâi înțelegându-l.

Arhitect
H. Munteanu

După fiecare corespondență se va da
de la Arhitect Costescu Oprirea referinței
Arhitect H. Munteanu

24-6-1946.

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	CRU
nr. 430	f 4

Parohiei Branistea
Jud. Mehedinți.

441/1946

4-12-946.

Cucernice Părinte,

La raportul Dvs. Nr. 13/946 și ca urmare adresei noastre Nr. 124/944, avem onoare a vă ruga să binevoiți a trimite de urgență Comisiunii, devizul în două exemplare, întocmit de către Serviciul Tehnic județean, spre aprobare.

Totodată vă rugăm să ne comunicați, după o atentă examinare a pisaniei dacă biserica a fost refăcută în anul 1892, cum ne comunicați cu Nr. 13/946, sau în anul 1882, cum ne-ați comunicat cu Nr. 14/944.

DIRECTOR,

V. Brătulescu

Șeful Serviciului,

S. Olteanu

Parohia Branistea
Jud. Mehedinți
Nr. 13.

18 Martie 1946

D. N. A. S.
ARHIVA
Collectia cruce
nr. 430 f. 5

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR
No 0441 29 MAR 1946
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Onor.
Comisia Monumentelor Istorice,
Bucuresti,

29.3.946 Referat
Sunt de parere si
comuniu textului mai
jos. Biserica, dupa anu
e din 1807 si reparata
in 1884. ditut
Hortileorom

Avem onoare a Va ruga sa binevoiti
a ne mairita o adresa, prin care sa se
aratate ca Biserica noastra nu este monu-
ment istoric.

Domnul Arhitect Em. Costescu a va-
zut o personal pe ziua de 11 Iulie 1944
si a afirmat ca nu prezinta absolut ni-
mic important, ca sa poata fi clasata ca
monument istoric, si nici vechime n'are,
fiind zidita in anii 1892-1894, precum se
poate vedea din planis.

Referat. 29.3.946. Sunt de
parere a raporta trimiterea
urmatoarei adrese oficiale:

Cuceruice Parinte,

La raportul Sr. N. 13/946 si ca
urmas adresei noastre N. 124/946,

avem onoare a va ruga sa binevoiti
a trimite de urgenta Comisiunii,
de vizul in doua exemplare, intoc-
mit de catre Serviciul Tehnic Judetean
spre aprobare. Va rugam tot de a

Asteptam acest act din partea D. V.,
intrucat vrem sa incepem lucrarile de resta-
urare si sa nu catem in vina ca am lucrat
fara aprobarea Com. Mon. istorice.

Paroh, P. C. Ghiesu

arhitect Em. Costescu
o atenta examinare a planisiei
daca biserica a fost zidita in
anul 1892, cum ne comunicati cu N. 13-1946 sau in
anul 1882, cum ne ati comunicat cu N. 14-1944.

29. III 946
de Comisia
Bucuresti

Parohia Branistea
Jud. Mehedinți
Nr. 13.

18 Martie 1946

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR
No 0441 29 MAR 1946
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S.
C. A. R. H. I. V. A.
Colecția crui
nr. 430 f. 5

Onor.
Comisia Monumentelor Istorice,
Bucuresti,

29.3.946 Referat
Sunt de parere si
comuniu textului mai
jos. Biserica, dupa cum
e din 1807 si reparata
in 1884. din
Honiile

Avem onoare a Va ruga sa binevoiti
a ne mairita o adresa, prin care sa se
aratate ca Biserica noastra nu este monu-
ment istoric.

Domnul Arhitect Em. Costescu a va-
zut o personal pe ziua de 11 Iulie 1944
si a afirmat ca nu prezinta absolut ni-
mic important, ca sa poata fi clasata ca
monument istoric, si nici vechime n'are,
fiind zidita in anii 1892-1894, precum se
poate vedea din planis.

Referat. 29.3.946. Sunt de
parere a raporta trimiterea
urmatoarei adrese oficiale:

Cuceruice Parinte,
La raportul Sr. N° 13/946 si ca
urmas adresei noastre N° 124/944,
areu onoare a va ruga sa binevoiti
a trimite de urgenta Comisiunii,
de vizul in doua exemplare, intoc-
mit de catre Serviciul Tehnic Judetean
spre aprobare. Va rugam tot de a

Asteptam acest act din partea D. V.,
intrucât vrem sa incepem lucrarile de resta-
urare si sa nu cãdem in vina ca am lucrat
fara aprobarea Com. Mon. istorice.

Paroh, P. C. Ghiesu

arhitect Em. Costescu
o atenta examinare a pisoniiei
daca biserica a fost refacuta in
anul 1892, cum ne comunicati cu N° 13-1946 sau in
anul 1882, cum ne ati comunicat cu N° 14-1944.

29. III 946
de Comisia
Honiile

24-6-1944

Referat. 3.8.944.
la teau. N^o 124/944

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CMU
nr. 430 f. 6

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR
N^o 01271 + 37 AUG. 1944
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Bis. parohială din Com. Brauistea -
jud. Mehedinți.

Conform delegației N^o 124/944, în ziua de 11 Iulie
1944, s-a vizitat biserica parohială din Com. Brauistea,
jud. Mehedinți, care în decursul timpurilor
a fost complet transformată, încât nu mai posedă
niciun element arhitectonic din vechea biserică.

Astfel, la intrarea principală i s-a adăugat un turn clo-
potniță cu acoperișul de tablă și cu bulb la fel cu cele răsești
din Ardeal, decorția exterioară este obținută prin pilăstrii verticale,
ferestrele de la corpul bisericii sunt gemene și cu o colona la mij-
loc, cornișă clasică, învelitoare de tablă, etc., etc.

S-au cerut parohiei ca odată cu derulul de reparații
ce va întocmi serviciul tehnic județean, să trimită și planuri
relevu, cât mai complete - spre a face propunerile
necesare pentru deplasare.

Arhitect S. Costin

J. VIII 944
Tehnic
V. G. [Signature]


11-VIII-944
In lasare
arhit. St. B. [Signature]

Arh.

24-6/1946.

Exp. 2/11.

Bisericii Sf. Nicolae din
Comuna Brăniștea
Jud. Mehedinți.



813/1946

Cucernice Părinte,

La adresa Dos.Nr.24/946, înregistrată sub Nr.813/946, avem onoare a vă înapoi adevizul în valoare de 90.000.000 lei, întocmit de Serviciul Tehnic al Jud. Mehedinți, pentru renovarea bisericii parohiale din acea comună, -cu modificările făcute în vederile Comisiei, rugându-vă ca înainte de începerea lucrărilor să le trimiteți spre aprobare un proiect complet al bisericii cu planuri, fațade, secții, din care să se vadă modul de executare a zidurilor și a intrării adăugate, conform modificărilor din deviz.


Lucrările se vor face în etape succesive, în ordinea urgenței, executându-se cu precădere, scosul umezelei, consolidarea crăpăturilor și restaurarea învelitoarei de tablă.



DIRECTOR,
V. Brătulescu

Seful Serviciului,
S. Olteanu

Parohia Branistea
Jud. Mehedintz
Nr. 24



1946 Iunie 5.

Onor.
Comisiunea Monumentelor
Istorice, Bucuresti,

Ca urmare a deciziei Dv. Nr. 441/946,
avem onoarea a vă manina alăturat,
în dublu exemplar, devizul pentru res-
taurarea Bisericii, cu rugămintea de
a-l aproba (ntornit de seful tehnic județean).


Biserica, conform pisaniei, a fost
refăcută în anii 1882-1884.

Conform Regulamentului, când se
va tine licitație pentru angajarea
lucrării, este nevoie de un delegat al
Dv. care să fie de față; la stimpă, vă
răm comunicăm.



Paroh P. C. Glieshe

P.S. Vă rugăm să binevoiti, a opti
Dv. o copie - dacă se poate - majorindu-
tot în dublu exemplar devizul, ca să-l
trimitem și la Sf. Episcopie, unde rezolu-
ne va opti iarăși un exemplar.



19.6.946
Se trimite Parohiei
Emitent

MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru lucrările de renovarea localului de biserică din Parohia Branîștea jud.Mehedinti.-

Având în vedere că în parohia comunei Branîștea jud.Mehedinti, există un local de biserică veche, construită în anul 1882, care în prezent se află ruinată aproape în întregime, cu zidurile crăpate și igrasioase, cu pardoseala distrusă, cu turla de asemenea distrusă, având absolută nevoie de renovare.-

Am întocmit prezentul proiect în valoare de lei 90.000.000 (nouăzeci milioane), sumă ce se va da din fondurile de care dispuneți.-

Propunem executarea lucrării pe cale de regie sub supravegherea organelor Serviciului Technic.-

Termenul de executare al lucrării este de 4 luni dela data aprobării lucrării.-



ȘEFUL SERVICIULUI
INGINER

[Handwritten signature]

SUBINGINER

[Handwritten signature]


VERIFICAT

Conform art.23 din Legea pentru
Apărarea Patrimoniului Public.-
Subinginer

[Handwritten signature]

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia CMU
nr. 430 f. 9

Ra. Probu

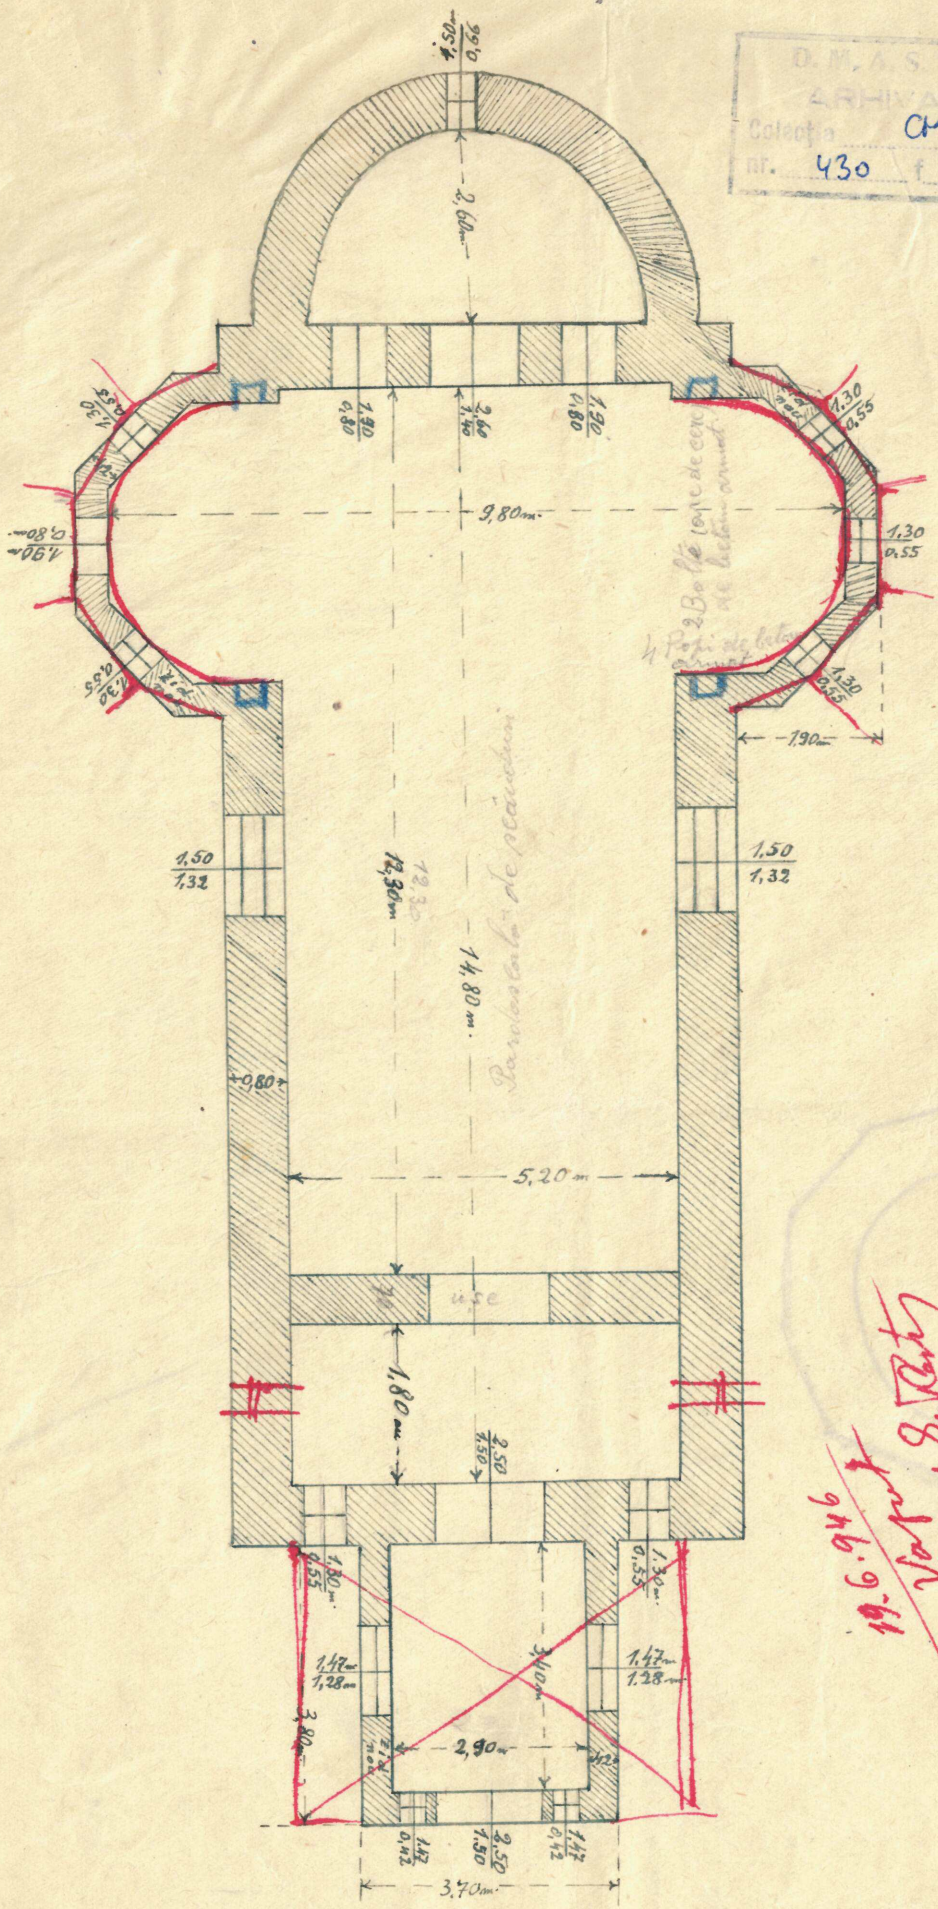

*19.6.946
Vasile Popescu
arhitect*

Planul Bisericii din comuna Branitea Judetului Mehedinti, specificand

modificarile ei. Scara 100/1m. = 1 cm.

SPITALUL DE STAT ODORHEI

Prefectura Județului Mehedinți
Serviciul Tehnic al Județului Mehedinți

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CMU
nr. 430 f. 10

ANTE-MĂSURĂTOARE ȘI DEVIZ ESTIMATIV

pentru lucrările de renovarea localului de Biserică din Comuna

Branștea Județul Mehedinți. -

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFEȚE		PREȚUL UNITAR	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
1	Săpături de pământ în formă de panturi pe lîngă zidul Bisericii, pînă la adâncimea fundației, pentru a se putea crea subzidirea fundației.									
	Părți laterale	2	13,60	1,00	1,50	40,800				
	Fatașoa	1	8,00	1,00	1,50	12,000				
	Semi-cerc altarului	1	11,20	1,00	1,50	16,800	m.c.			
	Total m.c.						69,600	6000		417,600
2	Demontarea zidăriei în fundație, încheier, roclu pe mici părți de 0,70m-0,80m. unde se va forma trotuarul.									
	Părți laterale fundație	2	12,80	1,00	1,50	38,400				
	Fatașoa	1	7,20	1,00	1,50	10,800				
	Semi-cerc altar	1	13,20	1,00	1,50	15,300				
	Părți laterale roclu	2	16,60	0,90	0,75	22,410				
	Fatașoa	1	7,00	0,90	0,75	4,730				
	Semi-cerc altar	1	13,10	0,90	0,75	6,820	m.c.			
	Total m.c.						98,460	20,000		196,920
3	Beton în fundație, format pe mici părți în cofraje, de 0,70-0,80m cu dozajul de 250 kg. Ciment la 100 m.c. nisip și 200 m.c. pietriș cioroit bine pătat cu marel, avînd ca scop acțiunea subzidire de fundație, pentru curățirea zidurilor originale și acoperirea igromiei.									
	Părți laterale	2	12,80	1,00	1,50	38,400				
	Fatașoa	1	7,00	1,00	1,50	10,500				
	Semi-cerc altar	1	13,20	1,00	1,50	15,300	m.c.			
	Total m.c.						64,200	190,000		121,980,00
4	Beton în elevație, soe lung format în cofraje pe mici părți de 0,70m-0,80m. bine pătat cu marel, avînd dozajul de 300 kg. Ciment la 100 m.c. nisip și 200 m.c. pietriș cioroit.									
	Părți laterale	2	12,70	0,90	0,75	17,145				
	Fatașoa	1	6,90	0,70	0,75	4,657				
	Semi-cerc altar	1	10,20	0,90	0,75	6,885	m.c.			
	Total m.c.						28,687	190,000		545,053,0
	Transport									20,035,330

Pe baza scosului igromiei de la localul bisericii se va aplica Sistemul Knapen, conform instructiunilor aici anexate, fara sa fie nevoie de darămatul zidăriei vechi în subziditul cu beton.

Se va aplica Sistemul Knapen ca la art. 1 de mai sus.

Idem ca la art. 1 și 2.

Idem ca la art. 1, 2 și 3.

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFEȚE		PREȚUL UNITAR	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
	<u>Sanuri</u>								30.055332	
5	Report. Pilastrii verticale în ziduri, de beton armat, câte 2 bucăți în fiecare parte laterala și câte o grinză tot de beton armat în forma de arc de cerc, în fiecare parte laterala, unde se vor demonta zidurile în locul ocupat de pilastrii și grinzi, precum și în interiorul intervalului dintre ele, în ambele părți, unde se vor construi zidurile noi în forma de sanuri după modelul și dimensiunile. Betonul armat va avea densitatea de 190 kg/m ³ . Ciment la 100 m.c. nisip și 2,00 m.c. pietriș ciuruit, cu 160 kg fier la 100 m.c. beton.									
	Pilastrii	4	0,40	0,60	4,00	3,840				
	Semicercuri grinzi	2	6,40	0,40	0,60	3,072	m.c.			
	Total m.c.						6,912	640000	4423,680	
6	Demontarea zidurilor în locul unde se vor construi ziduri noi în forma de sanuri, inclusiv locul ocupat de pilastrii și grinzi de beton armat. - Part. laterale	2	4,60	0,80	4,00	29,440				
	Semicercurile la	2	2,30	2,30	3,34	16,611	m.c.			
	Total m.c.						46,051	20.000	921,020	
7	Șopoteuri de pământ în fundație în ambele părți la sanuri	2	6,90	0,60	1,00	8,280	m.c.			
	Total m.c.						8,280	6000	49,680	
8	Balou în fundație la sanuri, cu densitatea de 250 kg. Ciment la 100 m.c. nisip și 2,00 m.c. pietriș ciuruit.									
	Volumele ca la Art. N° 7						8,280	190.000	1573,200	
9	Beton în elevație (pechi) cu densitatea de 350 kg/m ³ ciment la 100 m.c. nisip și 2,00 m.c. pietriș ciuruit format în cofraje și bine batut ca pământ.	2	6,80	0,50	0,75	5,100	m.c.			
	Total m.c.						5,100			
	Se acordă gabel unei	1	0,80	0,50	0,35	0,140				
	Roșnițe m.c.						4,960	190.000	942,400	
10	Zidărie de cărămidă roșie, zidărie cu mortar de var gros, la zidurile de la sanuri în ambele părți.	2	6,85	0,42	3,80	21,865	m.c.			
	Total m.c.						21,865			
	Se acordă gablurile: Une	1	0,80	0,42	1,90	0,638				
	Ferestre	5	0,55	0,42	1,30	1,502				
	Total m.c. de scăpat						2,140			
	Roșnițe m.c. zidărie						19,725	200.000	3.945,000	
11	Acoperis din tablă metalică deasupra zidurilor în forma de sanuri, inclusiv lemnaria de brad (parhauze) în corăzoabe căpriori și ferme, căpriori montați cu capetele în zidurile pechi și									
	Schimburi și lemn?									
	Transport . . .									31890310

Se va întocmi un proiect pentru sanuri cu planuri, fațade, secții, în interior având forma rotundă și în exterior un poligon cu laturi egale, ce se va trimite spre aprobare Comisiei. -

Idem ca la art. 5.

Idem ca la art. 5.

Idem ca la art. 5.

Idem ca la art. 5.

Idem ca la art. 5.

Idem ca la art. 5.

Nr de ordine

D. M. A. S. I.
 ARH: A.
 Colectia **CU**
 nr. **430** f. **11**

Arătarea lucrărilor

Partile ambare

Dimensiuni
 Lungimi
 Lățimi sau
 grosimi
 Înălțimi sau
 adâncimi

Culburi sau
 suprafețe

Partiale Totale

Pretul
 Unitar

Costul
 Total
 Lei.

Report

31.890.310

	Materiala din scanochuri de brood	2	9,00	x	2	3,20	=28,80	m.p.			
	Total m.p.								28,80	50.000	1.440.000
12	Tavanul din pipci de brood, trestie, ciuc, sărmă etc. lăcitate peste cofraje (ciute), prin cercuri, tencuit cu mortar de var gras amestecat cu ciment, închis vârmutul cu bofite de var dat de 3 ori	2	2,50	x	2	2,50	19,50	m.p.			
	Total m.p.								19,50	20.000	390.000
13	Demontarea a celor 13 bucăți de grinzi în pod ce sunt cu capetele băgâte, în ziduri și ridicarea lor cu 1,40 m mai sus, pusă cu capetele deasupra zidurilor, inclusiv rețeaua de dăca a ară și montanților și fermele cu grinzi ridicată, cu scopul de a se ridica bolta bisericii noi sus cu 1,40 metri.	13						13	luc.		
	Total Bucăți								13	30.000	390.000
14	Totul demontarea și ridicarea noii sus cu 1,40 m a ancorelelor de fier, ce sunt prinse în ziduri	3						3			
	Total Bucăți								3	30.000	60.000
14	Demontarea cărămizilor din pod deasupra boltii.	1	9,00	x	2	5,20 x 3,14 x 0,07	5,166	m.c.			
	Total m.c.								5,166	30.000	103.320
15	Demontarea grinzilor și modificarea fermei și montanților în pod deasupra altarului, pentru a se putea ridica bolta cu 1,40 m mai sus, grinzi puse cu capetele tot deasupra zidurilor, închis înălțimea cu fermele.	1	R.	-2,60	x	2	2,60 x 3,14	10,61	m.p.		
	Total m.p.								10,61	30.000	318.300
16	Demontarea boltii din biserica și altar ce exprinde cofraje în formă de saui-cercuri (ciute) prinse cu capetele în ziduri, pipci, trestie, sărmă, etc; se var, mai înderi ciutele prin adăugarea și încă 4 buc. Ciute construite din scânduri de brood groase de 6 cm suprapuse duble; se va ridica bolta cu 1,40 m mai sus, se vor prinse capetele ciutele în zidurile bisericii se vor bate din nașipate, precum și trestia comparată din nou, prinse cu sărmă, ciuc etc. Bolta din biserica:	1	12	x	2	8,20	98,40				
	" " altar	1	R.	-2,6	x	2	2,6 x 3,14 x 4	21,23	m.p.		
	Total m.p.								119,63	30.000	23.926,00
17	Scânduri de brood groase de 2,5 cm lăcitate abăturate peste extradorul boltii din biserica și altar								m.p.		
	Suprafața ca la Art. No 16								119,63	30.000	3.398,60
18	Tencuitul boltii cea din biserica și cea din altar cu mortar de var gras								m.p.		
	Suprafața ca la Art. No 16								119,63	8000	957,00
	Transport										61.867,35

Boltile sămurilor vor fi executate cărămidă sau beton armat ca cărămidă ca să nu asude și stivele pietrele noi.

Nu e nevoie de demontarea boltii vechi. Pentru înălțarea interiorului bisericii se poate lăsa pardoseala veche conform modificării dela art. 27.

Idem ca la art. 13.

Idem ca la art. 13.

Idem ca la art. 13.

Idem ca la art. 13.

Nr. de ordine

Aeratarea lucrărilor

Report

Partile similare	Dimensiuni		Cuburi, sau suprafețe		Prețul Unitar	Costul Total Lei
	lungimi	lățimi, sau grosimi	Partiale	Total		

19 Teucueli interioare cu mortar de var gras ~~auestacat cu ciment până la înălțimea de 2.00 m~~ iar restul cu mortar de var mediu a se putea repicta. Se vor doborî noi jaluzele teucuelile vechi în întregime, se vor curăți zidurile bine și apoi se va teucei.

Teucuelile interioare se vor executa de sus până jos (inclusiv soclul interior) numai cu mortar de var gras, nisip aspru, șpele a lăsa igrasia să evaporeze în afară și șpele a se picta draperia soclul interior al tricrii. Cimentul astupa șorii teucelilor nelăsând igrasia să se evaporeze, pictura nu prinde pe teucelile cu ciment.

Ziduri	2	8.20	x	5.10	88.56	
"	4	5.20	x	5.10	112.32	
"	1	4.10	x	5.20	22.88	
"	2	1.80	x	5.20	18.72	
Zidul la altar	1	7.50	x	5.20	39.00	
Ziduri la pînari	2	6.90	x	4.50	62.10	m.p.
Total m.p.						343.58
Se scad golurile uilor și ferestelor. Uși	4	1.40	x	2.60	14.56	
"	1	1.50	x	2.50	3.75	
"	5	0.80	x	1.90	7.60	
Fereste	7	1.30	x	0.55	5.00	
"	2	1.32	x	1.50	3.96	
"	1	0.60	x	1.50	0.90	
Total m.p. de scăzut						35.77

61.867.250
1846.860
307.81

Rămâne m.p. teucueli interioare

20 Teucueli exterioare cu mortar de var auestacat cu ciment zidurile înclină și che. Se vor desface teucuelile vechi în întregime și se vor curăța bine zidurile și apoi se vor re-teucei.

Teucuelile exterioare (fatade) se pot executa cu mortar de var și puțin ciment numai de la soclu în sus și numai în locurile unde se poate, restul dacă este în bună stare se va păstra pe loc. Soclul exterior se va teucei numai cu var gras și nisip aspru șpele a lăsa igrasia să se evaporeze în exterior sau soclul se va lăsa apărea din nou cărămida veche este în bună stare (90%), restul în curădu-se.

Ziduri	2	12.20	x	6.20	157.28	
"	1	5.80	x	6.20	35.34	
Zidul de la altar	1	10.20	x	6.20	62.24	
Ziduri la pînari	2	6.80	x	6.20	84.32	
Total m.p.						333.18
Se scad golurile uilor și ferestelor. Uși	1	1.50	x	2.50	3.75	
Fereste	1	0.80	x	1.90	1.52	
"	2	1.32	x	1.50	3.96	
"	7	0.55	x	1.30	5.00	
"	1	0.66	x	1.50	0.99	
Total m.p. de scăzut						15.22

Rămâne m.p. teucueli exterioare

21 Vârșitul zidurilor exterioare cu lapte de var doat de 3 oi

Suprafata ca la Art. Nr. 20

22 Teucutul brocului de la zidurile turbate cu mortar de var auestacat cu ciment

317.96 8000 2.543.680
317.96 600 190.776
4.32 8000 34.560
66.503.126

Total m.p.						4.32
Transport						8000

Nr. de ordine

D. M. A. S. I.
 ARH. A.
 Colectia *Orni*
 nr. 430 f. 12

Partile similare

Dimensiuni
 Lungimi
 Latimi sau
 grosimi
 Ancheti sau
 adancimi

Cuburi sau
 suprafete

Partiade Totale

Pretul
 Unitar

Costul
 Total
 Lei

Acritarea lucrurilor

Report

66.503.126

23 Varnitul zidurilor de la turla in partea inferioara
 dat de 3 ani cu lopate de var

4 3,40 x 2,60 35,36 m.p.

Total m.p.

35,36 600

21.216

Renovarea acoperisului la turla.

24 Invelitoare cu tabla noua in partea superioara a
 turlei, incluziv sarpanita si asteriala din nou
 precum si aseziatul crucii mari deasupra
 turlei *Sghiarului si barane?*

4 $\frac{1,20 + 0,80}{2} \times 1,10$ 4,40

4 $R = 0,60 \times 0,60 \times 3,14$ 4,52

4 $0,70 \times 1,70$ 3,38 m.p.

Total m.p.

11,30 60.000

678.000

25 Preparatiunea acoperisului la partea inferioara a
 turlei, prin inlocuirea $\frac{1}{2}$ din suprafata
 tablei vechi cu tabla noua

4 $\frac{3,60 + 1,20}{2} \times 1,90$ 18,24

4 $\frac{1,20 + 2,40}{2} \times 1,20$ 8,64

4 $\frac{1,00 + 2,40}{2} \times 1,40$ 9,52

4 $1,10 \times 1,50$ 6,66 m.p.

43,00 30.000

1.290.000

26 Schelaria la turla Bisericii din lemn de brad
 si salcam, pentru a se putea lucra
 renovarea turlei

1

Global

250.000

27 Pardoseala din scanduri de stejar in Biserica si
 altar, groase de 5cm. batute peste grinzi, care de
 stejar de 10/12 cm. in pestime.

*Se recomanda pardoseala din lespezi de
 piatra cioplita 0,70 x 0,70 x 0,10 asezate pe nis
 sau caramida dublu presata.*

*Nu se aproba. - Pentru inaltarea clă
 se vor face sapaturi in jurul bisericii,
 o raza de circa 15 m., dirijand prin rig
 (panturi) apele spre exteriorul curții, și
 ca adancime, asa fel ca sa
 din pamant sa ramana de p
 putini 1,10 m. adancime (se
 face sondajii). -*

~~Se va face uniplitura de balast pentru supra
 inaltarea pardoselei cu 0,10 m. iar stratul de
 supra unipliturii adica sub pardoseala va fi
 uniplat de piatra. Se vor bate perisajii
 pe lauga ziduri din scanduri de brad~~

1 12,30 x 5,20 63,96

1 1,80 x 5,20 9,36

La altar 1 $R = 2,60 \times 2,60 \times 3,14 = 10,61$

2 $\frac{6,90 \times 2,90}{2} = 13,11$ m.p.

97,04 35.000

3.396.400

Total m.p.

Constructia unei marchize in facta

28 Sapaturi de pamant pentru
 fundatie

2 3,80 x 0,55 x 0,80 3,344

1 3,40 x 0,55 x 0,80 1,672

Total m.c.

4.840 6000

29.040

29 Beton in fundatie cu densitat de 250 Kgr.
 ciment la 100 m.c. nisip si 200 m.c.
 pietris ciuruit

Idem ca la art. 28 de mai sus. -

Volumeul ca la Art. No. 28

Transport

m.c.
 4.840 190000

919.600

73.087.382.

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFEȚE		PREȚUL UNITAR	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
36	Report Tencuială zăvănită în interior și exterior, cu mortar de var, încheiere pământul dat de 3 ori cu țigle de var								77.485.828	
	Interior v. Ziduri	2	3.40	x	3.00	20.40				
	Exterior	1	2.90	x	3.00	8.70				
	Ziduri încheiere pământul dat cu mortar de ciment	2	3.80	x	3.70	38.12				
		1	3.80	x	3.70	14.06	m.p.			
	Total m.p.						71.28			
	Secund gherile Tri	2	1.50	x	2.50	7.50				
	Ferestre	4	1.28	x	1.47	7.52				
	"	4	0.42	x	1.47	2.47				
	Total m.p. de rășnit						17.49			
	Române m.p.						53.79	6000	322.740	
37	Strat izolatoriu de carton gudonat									
	meșat de suprașochului la zăvănit, Bisericii și marșize, de nașne adate cu pământul și șochului									
	3 foi de carton Părți laterale	2	12.70	x	0.90	22.86				
	suprafețe cu Fărăda	1	6.90	x	0.90	6.21				
	cartonul înăuntrul Șerănece altare	1	12.20	x	0.90	9.18				
	Sămni	2	6.80	x	0.50	6.80				
	Marșize	2	3.80	x	0.50	3.80				
	"	1	3.40	x	0.50	1.70	m.p.			
	Total m.p.						50.55	15.000	758.250	
38	Șablone din lemn de brad în m.p. forate, unite cu pragul de stejar, încheiere fierărie necesară ca: broșate, balneale, jare, etc. granuri și nepăsitul dat de 3 ori, total șablone 4 g. a.									
	Une în 2 canate	1	0.50	x	1.50	3.75				
	Ferestre	2	1.28	x	1.47	3.76				
	"	2	0.42	x	1.47	1.24				
	Une la șablone după M. Naște	1	0.80	x	1.90	1.52				
	Ferestre la hâneri	5	0.55	x	1.50	3.53	m.p.			
	Total m.p.						13.85	120000	2.493.000	
39	Șarini din șarini de brad groase de 2.5 cm. lățite la șarini marșize, încheiere pământul dat de 3 ori cu apă și în culoare de ulci									
	La șarini	2	7.90	x	0.40	6.32				
	" marșize	2	4.30	x	0.45	3.87				
	"	2	3.80	x	0.15	3.42	m.p.			
	Total m.p.						13.61	50000	680.500	
40	Trahari de beton turnat pe grădine de 0.10 m. de înălțime în Bisericii și marșize cu diametrul de 1400 mm. ciment la 1.00 m. c. m.p. 2.00 m. c. beton și ciment turnat și încheiere Părți laterale									
	Suprafețe altare	1	11.80	x	0.60	7.08				
	În fața Bisericii	2	3.40	x	0.60	4.08				
	" marșize	1	3.65	x	0.60	2.19				
	Părțile laterale ale "	2	3.90	x	0.60	4.68	m.p.			
	Total m.p.						40.11	15000	601.650	
	Transport									82341.962

Idem ca la art. 35

ARHIVA
CMU
430 13

Acum articol se suprimă din cauza neexecutării acestor lucrări. (Stratul izolator ideal este din bitum, cartonul gudonat putrește după 2-3 ani).

Despreile de m. turna în cofraje, reparat în curte, de 100 x 100 x 970, facă 2 fi. fabricate. Rosturile vor fi pline, ca să nu stagneze apele. Trahanul va avea lățimea de 1 m. Apse a îndepărta apele de la vechiul Bisericii.

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părțile similare	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFETE		PREȚUL UNITAR	COSTUL	
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	PARȚIALE	TOTALE		TOTAL	
									Lei	B.
41	Report: Reparatiunea acoperișului biseriei Se va demonta tablou în întregime de pe acoperișul bisericii în altav, se vor tăia și marginile fiilor de tablă și se vor înlocui cele răzuite și găurite cu altele noi ce sunt aprovizionate 200 bucăți tablă nouă comparată model demult.								82341968	
	Parti laboare	2	16.70	x	6.20	207,80				
	acoperis altav	1	11.50	x	6.20	35.65				
	Total m.p.							243,45		
	Se pune prof. cazate de hota							20,00		
	Frata Române m.p.							223,45	20.000	4.469.000
42	Fata de beton în fata marelui ou de rajul de 400 kg. ciment la 100 m.c. nisip 200 m.c. și pietriș cizuit, tăcut și selectat. Treptă N° 1	1	1.00	1.60	0.50	0.800				
	N° 2	1	0.65	1.60	0.18	0.270				
	Total m.c.							0.870	190000	165.300
43	Înșiratul țigărilor vechi, cu suprafața curbă de subțiri de 3 ori, după ce se vor răsucite vechi suprafața.	3	2.25	x	1.50	2.50				
	Ferestre	2	2.75	x	1.32	1.50				
	Uși	3	2.15	x	0.55	1.30				
	Uși	2	2.20	x	0.80	1.90				
	Total m.p.							37.74	25000	943.500
44	Ridicarea milor cu 0,40 m. mai sus în ziduri pentru a se supraînălța parapetele în biserică.	5								
	Total Buget							5	18.000	60.000
45	Diverse și neprevăzute									2020338
										90000.000
	Prezentul Deviz, se include pentru suma de la nouăzeci de milioane									
	Seful Serviciului Inginer Sef									
	Seful Secției Subinginer									
	Total									

Văzut și aprobat :

INGINER,

Ante-măsurătoare și devizul de față s'au încheiat de subsemnatul

VERIFICAT SI APROBAT
din punct de vedere tehnic și conf.
art. 23 din LLP. A. P. B. - și găsit
bun pentru suma de
Seful Serv. Technic Jud.

, în

193

CONDUCTOR,

Inginer,
Data

19.6.946
Modificat devizul în
vederile Comisiunii
arhitect G. M. Căteș

[Signature]

24-6-1944

1) Parohiei Grănești
Judetul Mehedinți.



2) Direcția Tehnică
al Judetului
Mehedinți

124/1944

13 MART. 1944

Biserica parohială cu hramul "Sf. Voievozi" din comuna Branștea, județul Mehedinți, fiind grav avariată de cutremurul din anul 1940 și având absolută nevoie de reparațiuni serioase, avem onoarea a vă ruga să vă adresați Serviciului Tehnic al județului Mehedinți pentru întocmirea planurilor și devizului necesar, care vor fi trimise în dublu exemplar Comisiunii Monumentelor Istorice spre aprobare. S'a intervenit în acest sens și către acel serviciu tehnic.-


DIRECTOR,

V. Brătulescu

SEF DE SECȚIE,

Gh. Croitoru

Referat. 8. 3. 944.
la Tem. 124/944



Bis. paroh. „Sf. Voievozi”, Com. Brauștea,
jud. Mehedinți.

Din actele de față se constată că, această biserică,
zidită în 1807, a fost refăcută din nou sau numai în parte în anii

8. 3. 944 Referat 1882-1884. - În consecință, sunt de părere a se aproba
sunt de părere să se trimitere următoare: adrese oficiale atât parohiei, cât
fiecărui mai urgent și serv. Tehnic al jud. Mehedinți;
amabile intervenții

arhitect
G. Niculescu

- 1/ Parohia Brauștea, jud. Mehedinți.
- 2/ Serv. Tehnic al jud. Mehedinți.

9. III 944.
Se intervine
V. J. J. J.

„Biserica parohială cu hramul „Sf. Voievozi”, din Com.
Brauștea, jud. Mehedinți, fiind grav avariata de
cutremurul din anul 1940 și având absolută nevoie
de reparațiuni serioase, avem onoarea a vă ruga
să vă adresați ~~postea~~ serv. Tehnic al jud. Mehedinți
pentru întocuirea planurilor și diriguirii necesare, care
vor fi trimise în dublu exemplar Comisiunii Mon. Istoria
pe aprobare. Să intereseze în acest sens și căuta
acel serviciu tehnic.”

arhitect E. V. Costeș

ROITTUO A LA EJANDITAN TIJO TZIAN
+ ORIGINAL + 2510 + 20 JAN 1944
COMITATUL A MONUMENTELOR HISTORICE

D. M. A. S. I.
ARHIVA I
Colectia *Crucii*
nr. 430 f 16

Parohiei Braniștea
Judetul Mehedinti

- 1 FEB. 1944

124/944


CUCERNICE P A R I N T E,

La raportul no.4/944,avem onoare a vă face cunoscut
că s'a dat delegație d-lui arhitect șef Em.T.Costescu,care
va veni la fața locului să cerceteze monumentul și să re-
fere Comisiunii asupra nevoilor de restaurare.-

DIRECTOR,

V.Brătulescu

Șeful Secției,



Gh.Croitoru

Parohia Brauistea
Jud. Mehedinți
Nr. 4

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR

N. 0124 + 20 JAN 1944 +

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

1944 Ianuarie II

Onot.
Comisia Monumentelor istorice
de pe lângă Ministerul Cultelor,
București,

20 I 1944
Târnăvi

Referat 22.1.1944

Biserica este de zid. din
1807.
Sunt de părere să se
dea delegat arhitectului
regiunii
archit. Sr. Balș

int. par
selectie la
V. Ionescu

Biserica parohiei noastre fiind monu-
ment istoric si găsindu-se într-o stare
quasi ruinată, cât a devenit improprie
ofierii serviciului divin, are absolută
nevoie de reparație, pe care intenționăm
să o începem neapărat în primăvara
anului 1944.

Pentru aceasta, avem onoarea a
Vă ruga să binevoiti a ne trimite
un tehnician pentru constatarea stării
Bisericii, la fata locului, și pentru întocmirea
Servizului în vederea reparației.

Încă odată, Vă rugăm foarte staruitor
să ni se trimită cât mai repede la putere
un tehnician, pentru ca serviciul să fie făcut
cât mai din vreme, în așa fel, ca să putem
incepe lucrările de reparație îndată ce va
veni primăvara, mai ales că altă Biserică
nu avem în parohie, iar credincioșii tot mai
pe aceste vremuri de restriște sunt lipsiți de un
sfânt Lăcaș, unde să-șialte rugămintei fierbinti
la tre Dumnezeu.

Cu toată stima,
Paroh, Dr. C. Ghiescu



N. VI-1246
a trecut în pronal
Mint. nr. 322
Referat. 19. 6. 946
Teu. 813. /946.

22. 6. 946 de Subcomisia
Tehnică. arhitect
oficiu nr. 17

Concept
nr. 430. 17

Bis. Sf. Nicolae din Com. Braușița -
jud. Mehedinți.

24. VI. 946.
După aprobarea
Subcomisiei Tehnică
ce răspunde
proiectului.

Sunt de părere să se aprobe următorul
text de răspuns:

W. S. 17

Cuvenie părinte,
la adresa S. N. 24/946, înregistrată sub N. 24/946, avem onoarea a vă raporta derizul în valoare de 90.000.000, lei, întocmit de Serv. Tehnic al jud. Mehedinți, pentru renovarea bisericii parohiale din aceeași comună, — cu modificările făcute în vederea Comisiei, rugându-vă să ca înainte de începerea lucrărilor să ne trimiteți ~~un proiect~~ spre aprobare un proiect complet al bisericii cu planuri, fațade, secții, din care să se vadă ^{modul de} execuția lucrărilor și intrării adăugate, conform modificărilor din deriz.

Lucrările se vor face în etape succesive, în ordinea urgenței, executându-se cu precădere zidurile umarelui, consolidarea și repararea și restaurarea înaltului de tablă

24. 6. /946

se aprobă

P. Antonescu

se sunt de parerea a
in lucrările ce cuprind
ce respunde de arhitect
oficiu nr. 17




Biserica parohială-
die Com. Brauștea - jūd. Mehedinți
cu hramul „ Sf. Voerzi ”
clădită la 1807, reparată 1884 (com-
plet transformată). -

Em Costescu

Iulie 1944.

Parohia Braștea
Jud. Mehedinți
Nr. 14.



1944 Febr. 21.

Anuar 1909.
Bis. paroh. Sf. Voievozi e de zid. 1884.
să clădit la 1807, să reparat la 1884.
Emit Costeș

8 Martie 1944.

Conform informațiilor
date la 10.2.944 de către d.
Măior pensionar P. Popescu
din Com. Braștea, care se
interesează de această biserică,
rezultă că această
biserică a fost re-clădită
pe locul celei vechi, de către
zidari italieni, pe timpul
Copilăriei sale.

arhit. Emit. Costeș

Stimate Domnule Arhitect,

La scrisoarea d. v. din 10 Febr. 1944, avem onoare
a vă răspunde:

Anul când a fost clădită Biserica parohiei noastre
cu hramul „Sf. Voievozi”, nu se știe.

Din cele două pisani - una aforă, deasupra usii, la intrare,
săpată în piatră; a doua, în tindă în partea dreaptă, scrisă în lătar
rezultă clar și precis că a fost clădită în anul 1882.
Cităm cele două pisani:

I „Veniți, filoz, în sâmul meu, Casa lui Dumnezeu suntă
și ei că iubesc Sionul, mult iubiri vor fi de Dumnezeu.

Acest sfânt Locas s'a ridicat în anul 1882 cu toate
cheltuiala și ostenelele binefăcătorului d. v. Petre
Miron și soarta sa Elena Petre Miron, proprietarul
măria Cearanagu, inspirati de providenta și amore
câte Casa Domnului.”

II Incepută la 1882. Finit la 1884. Acest edificiu s'a
făcut în timpul Majestății Sale Regelui Carol
și Maj. Sa Regina Elisabeta, cu binecuvântare

Prea Sfințitului nostru Episcop al Râmnicului - horezului
Severin D. D. Ștefi Populescu, cu mare cheltuială și
osteneală a d. v. Petrache Miron și soția sa Elena.

Din aceste două pisani, reiese clar și precis că Biserica a
fost clădită în anii 1882-1884. Însă enoriașii mai bătrâni
din parohie susțin că în acest timp, Biserica a fost re-
valută numai, nu clădită din temelie către poppetarul
Petre Miron fiind lungită și măltată. Nu există însă ni-
meni care să poată spune când a fost clădită din
temelie, de unde ar reesi că datează din întregătatea
vechime.

Așa că nici noi nu știm ce să credem. Poate că, prin
venirea d. v. la fata locului, s'ar putea preciza, dacă este
sau nu, monument istoric.

Domniei Sale

Domnului Arhitect Dom. T. Costeș
București

Mentionăm că este igrasioasă peste tot și aproape improprie
cultului divin, merit să se impună să fie complet răzămăta
și clădită alta Sfânta Biserica, din temelie.

- Înțeleg însă în acestora *Dr.*, ca să ne dați kolegarea
legală.

Dacă din ale arătate de noi, vedet că nu este
monument istoric, vă rugăm să binevoiti a ne răspunde
de urgență, ca să știu ce mături să luăm.




Ca într-o scrisoare,
Paroh. Dr. C. Mieslu



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
SERVICIUL TEHNIC

Str. General Berthelot, 28

Parohia bis. Brăniștea
Jud. Mehedinți



Opie

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

10. Febr. 1944.

Onorabile Părinte,

Ca urmare rapoartelor № 4 și № 9/1944,
avem onoare a vă ruga să binevoiți a
ne comunica de urgență în ce an a fost
clădită biserica parohială cu hramul „Sf.
Voievozi” din com. Brăniștea, jud. Mehedinți,
dacă are vreo inscripție în piatră (pisanie)
sau scrisă, în culoare (pictură)?

Aceasta spre a stabili dacă biserica este
monument istoric sau nu. —

Arhitect M. V. Costescu

Parohia Branistea
Jud. Mehedinti; nu are casa

21 / 1 / 1913

A. Besuianu

Parohia Branistea
Jud. Mehedința
Nr. 9

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia coi
nr. 430 f 20

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
1005858 DIN - 4 FEB. 1944 *
REGISTRATURA GENERALA

1944 Ianuarie 31

Onor.

Comisia Monumentelor istorice
de pe lângă Ministerul Cultelor,
București,

Cu adresa noastră Nr. 4/1944, am
cerut să ne trimiteți cât mai urgent
un reprezentant al D.V. (tehnician),
care să ne întocmească devizul
pentru renovarea Bisericii parohiale
noastre, care este monument istoric și
are absolută nevoie de renovare.

Și pe această dată, din nou
venim să vă rugăm să binevoiti a ne
trimite un tehnician, cât mai repede
fiat; aceasta, pentru ca îndată ce va sosi
sezonul de lucru, să putem imediat începe
lucrarea, fără a mai avea vre-o întârziere
cu îndeplinirea formalităților, pe care
le vom face cât mai din vreme.

Păteș, M. C. Iulescu



Cu nr: 124/1944
pla det delegatie
d- lui onor. Dn. I.
Costescu

Parohia Branistea Jud. Mehedin.

Către
Domnul Arhitect *Dr. Costescu*

ARHIVA
Colecția *CPM*
nr. *430* f. *21*

Posta
CISMIR
2 FEB 44

2 FEB 44

Comisiaa Monumentelor istorice

Str. General Berthelot nr. 28
Sectorul II

nr. 14



Bucuresti.

24-6-1944

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Telefon : 4.39.00

Serviciului Tehnic al județului
Mehedinți

D. M. A. I.
ARH. A. I.
Colectia <i>CM</i>
nr. 430 F 22

124/1944

13 MART. 1944

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Biserica parohială cu hramul "Sf. Voevosi" din comuna
Branăștea, județul Mehedinți, fiind grav avariata de cutremurul
din anul 1940 și având absolută nevoie de reparațiuni serioase,
avem onoare a vă ruga să ^{la meșteri} ~~vă adresați~~ ~~Serviciului Tehnic al ju-~~
~~dețului Mehedinți pentru~~ ^a întocmirea planurilor și devizului ne-
cesar, care vor fi trimise în dublu exemplar Comisiunii Monumen-
telor Istorice spre aprobare. S'a ^{făcut cunoscut} ~~intervenit în acest sens și~~
~~către~~ ~~acel~~ ~~serviciu~~ ~~tehnic.~~ ~~-~~
parohiei respective.

DIRECTOR,

V. Brătulescu

SEF DE SECȚIE,

Gh. Croitoru
Gh. Croitoru
